

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: GAR00000617

Číslo smlouvy objednatele:

I Smluvní strany

Objednatel:

Obec Mošnov

sídlo: Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov
zastoupené: Radomil Bodzsar, starosta obce
IČO: 00600792
DIČ: CZ00600792
bankovní spojení: 1766514309/0800, Česká spořitelna a.s.

zástupce ve věcech technických a realizačních:
Lumír Kuchař DiS.

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: OHLA ŽS, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 695
sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupená: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: 8010-503087443/0300, ČSOB, a.s
tel. ústř.: 596 157 225

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:
Ing. Martin Polášek – ředitel oblasti Ostrava

*dále jen **zhotovitel***

„Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel“
Obec Mošnov („objednatel“)- I-/ („zhotovitel“)

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 7. 2020 smlouvu o dílo: „**Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel**“, včetně dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, dále jen „smlouva o dílo“ či „SoD“.
- 1.2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provést změny předmětu díla v souladu se schváleným změnovým listem TLZ č. 10. Smluvní strany tímto dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 6**“) proto následovně mění článek II. Předmět a rozsah díla a článek IV. Cena za dílo.

V čl. II. Předmět a rozsah díla se doplňuje o nový odst. 2.10., který zní:

2.10. Předmětem díla jsou další práce (vícepráce) v rozsahu acenové specifikaci dle změnového listu TLZ č. 10, který je jako příloha č. 1 neoddělitelnou součástí tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě.

V čl. IV. Cena za dílo se text odst. 4.1. ruší a nahrazuje se textem, který nově zní:

4.1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran a činí:

92 633 580,00 Kč bez DPH

(slovy: devadesát dvamilionů šest set třicet tři tisíc pět set osmdesátkorun bez daně z přidané hodnoty)

Cena za dílo (v Kč)	
Cena dle SoD bez DPH	91 681 909,90 Kč
Změna vyvolaná TLZ č. 10 bez DPH	951 670,10 Kč
Cena dle SoD a TLZ č.10 bez DPH	92 633 580,00 Kč
DPH	19 453 051,80 Kč
Cena vč. DPH	112 086 631,80 Kč

Změnový list č. 10, včetně položkových rozpočtů tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 6 ke smlouvě.

- 1.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti bez změny. Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou oboustranně potvrzených stejnopisech.

„Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel“
Obec Mošnov („objednatel“)- /-/ („zhotovitel“)

Uzavření tohoto dodatku č. 6 bylo schváleno na 19. jednání Zastupitelstva obce Mošnov dne 23.06.2022 pod č. usnesení 19/224.

V Mošnově dne

V Ostravě dne

Za objednatele Obec Mošnov:

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

.....
Radomil Bodzsar
starosta

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

Název projektu: **Odkanalizování obce Mošnov**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 87 792 020,26

Zhotovitel stavby : OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b , 627 00 Brno, Divize Morava, Hlávkova 1, 702 04 Ostrava; IČ: 46342796

Objednatel stavby : Obec Mošnov, Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov; IČ 00600792

Datum: 10.06.2022

Revize: 14.06.2022

Změna dle :	§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	x	§ 222, odst. 9	
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10	

Předmět změny: **TZ 01.2 - Uliční stoky v povodí stoky A**
TZ 01.2 - Uliční stoky v povodí stoky A2
TZ 01.6 - Přeložky sítí technického vybavení (stoka A2)
TZ 02.2 - Příjezdová komunikace, zpevněné plochy stoka A a stoka A2

Popis změny: **Oprava komunikací v povodí stoky A a stoky A2***Popis vzniklého problému, včetně návrhu řešení:*




Na základě skutečností a geodetického zaměření skutečného provedení opravy komunikací na stoce A došlo k navýšení objemu prací. Dále je předmětem tohoto změnového listu oprava komunikace na stoce A2. Na základě vytyčení skutečného vedení infrastruktury a zjištění skutečných hloubek kanalizačních výtoků jednotlivých nemovitostí provedl autorský dozor přeprojektování kanalizace trasy stoky A2, včetně přeložení části el. vedení - sloupu NN/VO. V důsledku změny vedení trasy stoky A2 došlo k navýšení objemu prací opravy komunikace. V úsecích komunikace dotčené výkopem došlo k popraskání a místy ke zborcení komunikace. Pro zajištění bezpečného provozu komunikace bylo provedeno celoplošné odfrézování a následná pokládka finální asfaltové vrstvy.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele a souhlasným stanoviskem autorského dozoru.

Provedení prací jiným zhotovitelem není možné z technických důvodů vzhledem k potřebě jejich slučitelnosti s instalacemi pořízenými podle původního zadávacího řízení.

Přílohy:

- Z10.1 Text v záznamu z KD č.14 konaného 28.4.2022
- Z10.2 Situace
- Z10.3 Rozpočet
- Z10.4 Tabulka Evidence změn

Dopad změny na provádění díla			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD, respektive dle termínu schváleného v dodatku č.3
		nový termín dokončení díla :	06/2022
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	951 670,10
		bez dopadu na cenu díla:	0
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		951 670,10 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz příloha Z10.4 tab. EVIDENCE ZMĚN
5.	Celková změna %		viz příloha Z10.4 tab. EVIDENCE ZMĚN
Za zhotovitele:		funkce	Podpis
Ing. Michal Oulehla, OHLA ŽS a.s.		Vedoucí projektu	
Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)			
Ing. Sergej Gorbunov, Koneko, spol. s r.o. Ing. David Molnár, Koneko, spol. s r.o.		osoby oprávněné jednat ve věcech technických	
Za Technický dozor stavby (TDS):		funkce	Podpis
Jan Blinky, LAVI ENGINEERING, s.r.o.		osoby oprávněné jednat ve věcech technických	
Za objednatele:		funkce	Podpis
Radomil Bodzsar, starosta obce		osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za budoucího provozovatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
Ostatní ujednání:			

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Obec Mošnov
Radomil Bodzsar
Starosta obce
Mošnov 96
742 51 Mošnov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. S. Gorbunov
603834685Ostrava
10.6.2022

Věc: Odkanalizování obce Mošnov
Stanovisko AD ke změnovému listu TLZ-10

Změnový list TLZ-10 řeší konečné úpravy stavbou dotčených komunikací na stoce „A“ a „A2“.

Po provedení geodetického zaměření skutečného provedení opravy komunikací na stoce „A“ bylo zjištěno, že oproti předpokladu projektu došlo k navýšení objemu prací.

V případě stoky „A2“ po vytyčení stávajících IS a ověření jejich průběhu kopanými sondami bylo zjištěno, že výstavbu stoky není možné z důvodu kolize s IS realizovat dle schválené PD.

Z uvedeného důvodu v průběhu realizace projektant/AD přepracoval návrh trasy stoky s ohledem na zjištěný stav a prostorové možnosti staveniště a provedl úpravu nivelety stoky s ohledem na zjištění skutečných hloubek kanalizačních výtoků jednotlivých nemovitostí. Součástí návrhu bylo přeložení části el. vedení – sloupu NN/VO.

V důsledku změny vedení trasy stoky A2 došlo k navýšení objemu prací opravy komunikace. V úsecích komunikace dotčené výkopem bylo provedeno celoplošné odfrézování a následná pokládka finální asfaltové vrstvy.

K návrhu změnového listu za AD bez připomínek.



Ing. Sergej Gorbunov
HIP KONEKO

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.14

„Odkanalizování obce Mošnov“

konaného dne **28.04.2022**

V zápise je uveden termín dalšího kontrolního dne a je rozeslán pouze elektronicky. Originál je založen u TDI. Podkladem pro jednání kontrolního dne byl postup stavebních prací v předešlém dokončeném měsíci.

PROGRAM JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE:

1. Projektová dokumentace, RoPD
2. Zpráva ZHOT o postupu prací
3. Vyhodnocení harmonogramů – finanční plnění, změnová řízení
5. Různé

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, RoPD

RoPD - Projekt „Odkanalizování obce Mošnov“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství pro podporu v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Evidenční číslo: 129D303004118

Číslo jednací RoPD: 47876/2020-MZE-15131

Parametry:

název	RoPD	CELKOVÁ Skutečnost	Rozdíl Skut/RoPD
Kanalizační stoka (stoky a výtlačky)	7 297,60m	7 178,34m	- 119,26m

2. ZPRÁVA ZHOTOVITELE O POSTUPU PRACÍ

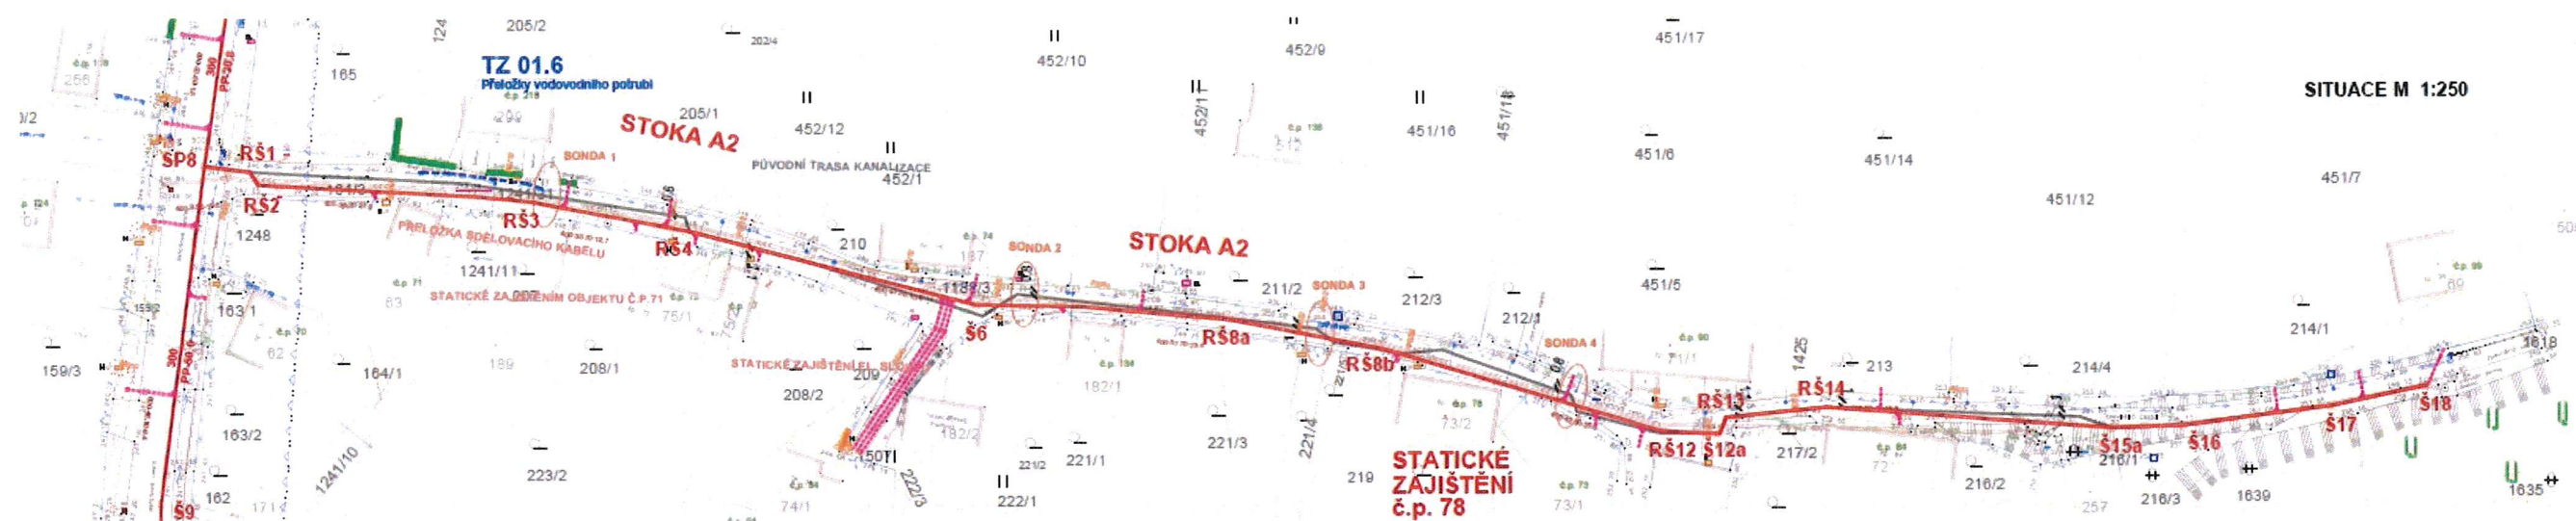
- dle sdělení ZHOT budou od 10.5.2022 postupně zahájeny asfaltové práce na opravě silnic SSMSK. Předpoklad dokončení do konce května 2022.

3. FINANČNÍ PLNĚNÍ, ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

Finanční plnění – ve sledování – po dokončení asfaltů.

Změnová řízení - po dokončení asfaltových prací na silnicích SSMSK, ZHOT zpracuje případný doměrkový ZL na asfalty. Podklady (ZL) nutno předat OBJ nejpozději do 16.6.2022.

Z10.2 - Situace



21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	260,000	240,00	20,00	443,00	8 860,00
22	K	592174880	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	kus	262,400	242,40	20,00	223,20	4 464,00
Cena díla									419 986,60

NOVÉ PRÁCE

TZ 01.2 - Uliční stoky v povodí stoky A

1	K	573111113	Postřik živičný infiltrační množství 1,5 kg/m2	m2	13 907,000	0,00	13 907,00	30,90	429 726,30
2	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	ks	20,000	0,00	20,00	2 290,00	45 800,00
3	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	0,00	3,00	2 150,00	6 450,00
4	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	10,000	0,00	10,00	1 210,00	12 100,00
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	10,000	0,00	10,00	73,40	734,00
6	K	167151101R	Nakládání kameniva drceného na dopravní prostředek	m3	6,000	0,00	6,00	154,00	924,00
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,000	0,00	6,00	79,20	475,20
8	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	20,000	0,00	20,00	53,40	1 068,00
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	21,000	0,00	21,00	1 210,00	25 410,00
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	0,00	2,00	3 730,00	7 460,00

11	K	997211612	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,000	0,00	4,00	131,00	524,00
12	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	4,000	0,00	4,00	253,00	1 012,00
Nové práce celkem									531 683,50

Změna CELKEM			
více práce	méně práce	rozdíl	VCP/MNP
951 670,10	0,00		951 670,10

Cena navržená zhotovitelem

951 670,10

Příloha dodatku č. 6 - Rozdělení uznatelných a neuuznatelných nákladů

Celková cena díla:

v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH
87 792 020,26	106 228 344,51

Neuznatelné náklady:

TZ 01.5_A Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky A)
TZ 01.5_B Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky B)

Celkové neuuznatelné náklady dle smlouvy:

10 660 687,07

Celkové uznatelné náklady (ostatní položky v rozpočtu) dle smlouvy:

95 567 657,45

Celkové neuuznatelné náklady dle smlouvy včetně dodatků 2 až 6:

17 022 852,52

Celkové uznatelné náklady (ostatní položky v rozpočtu) dle smlouvy včetně dodatků 2 až 6:

95 063 779,28

Celkové náklady včetně dodatku 2 až 6

112 086 631,80

	Uznatelné náklady	Neuznatelné náklady
Dodatek č. 2		
ZL č. 1 - TZ 02.1, TZ 02.2	403 524,02	0,00
Dodatek č. 3		
ZL č. 2	0,00	3 375 363,19
ZL č. 3	56 613,66	0,00
ZL č. 4	77 000,00	0,00
Dodatek č. 4		
ZL č. 5	1 565 687,06	0,00
ZL č. 6	0,00	0,00
Dodatek č. 5		
ZL č. 7	0,00	1 957 717,39
ZL č. 8	159 488,00	0,00
ZL č. 9	-3 630 411,08	-75 092,60
Dodatek č. 6		
ZL č. 10	951 670,10	0,00

OBEC MOŠNOV
PSČ 742 51
IČ: 00600792 DIČ: CZ00600792

Průcha

Tabulka EVIDENCE ZMĚN

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov

AKTUALIZACE K: 14.6.2022

čís. ZL	Předmět změny	Popis změny	Stav	Cena Kč bez DPH						Hodnota změny	\$Z22 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	\$Z22 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	\$Z22 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	\$Z22 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	\$Z22 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)
				Odpčet 4	Přípočet 5	Rozdíl 8	7								
1	2	3											11	10	12
1	TZ 02.1 Čerpací stanice TZ 03.1 Čerpací stanice	Zapažení stavebních jam čerpacích jímek ČS 1 a ČS 2 - Změna výměr štetovnicových stěn	podepsáno 9.4.2021	0,00	403 524,02	403 524,02	403 524,02								
2	TZ 01.2 Uliční stoky v povodí stoky A - Odvětloná kanalizace uliční stoky A2 TZ 01.5 A Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky A2) TZ 01.5.A, sekčí kan. Připojení přípojek desťové kanalizace (stoky A2) TZ 01.6 Přeložky sítě technického vybavení	Změna vedení trasy stoky A2 vyvolaná kolizí s vedením stávajících infrastruktur	podepsáno 4.10.2021												
3	TZ 03 - Čerpací stanice ČS 2	Změna vedení přípojeky NN pro ČS 2	podepsáno 9.9.2021	0,00	3 375 363,19	3 375 363,19	3 375 363,19	3 375 363,19							
4	PS 01 - Čerpací stanice ČS 1 PS 02 - Čerpací stanice ČS 2	Dodávka a montáž pachového filtru pro ČS 2 a provedení přípravy k pozdějšímu případnému osazení pachového filtru na ČS 1	podepsáno 9.9.2021	9 027,86	65 641,52	56 613,66	74 669,38								
5	TZ 01.4 Uliční stoky v povodí stoky B (Stoka B3)	Změna vedení trasy stoky B3 - kolize s vedením plynovodu - posun vedení částí trasy stoky B3 do krajnice komunikace I/58	podepsáno 11.11.2021	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00							
6	TZ 01_A Obnova komunikace do 1 roku po ukončení stavby - stoky povodí A TZ 01_B Obnova komunikace do 1 roku po ukončení stavby - stoky povodí B	Celoplošná oprava silnic v povodí stoky A a povodí stoky B po dokončení kanalizace	podepsáno 18.11.2021	36 156,15	1 601 846,21	1 565 687,06	1 638 005,35	1 638 005,35							
7	TZ 01.5 - Domovní kanalizační přípojeky - kanalizační odbočení	Upřesnění parametrů stok na základě geodetického zaměření dokončené stavby	15.2.2022	766 877,61	766 877,61	0,00	1 533 755,22	1 533 755,22							
8	TZ 01.1 - Stoka A TZ 01.2 - Uliční stoky v povodí stoky A	Upřesnění parametrů - počet šachet dle skutečného stavu	15.2.2022	0,00	1 957 717,39	1 957 717,39	1 957 717,39	1 957 717,39							
9	TZ 01.1 - Stoka A, TZ 01.2 - Uliční stoky v povodí stoky A, TZ 01.3 - Stoka B, TZ 01.4 - Uliční stoky v povodí stoky B, TZ 01.6 - Přeložky sítě technického vybavení, TZ 02.2 - Příjezdová komunikace, zpevnění plochy, TZ 02.3 - Příjezda NNA, TZ 02.5 - Výcház z ČS 1, TZ 03.5 - Výcház z ČS 2, TZ 01.5.B - Domovní kanalizační přípojeky - kanalizační odbočení (stoky B) - NEUZÁMĚLNÉ NAKLADY	Upřesnění parametrů stok na základě geodetického zaměření dokončené stavby	15.2.2023												
10	TZ 01.2 - Uliční stoky v povodí stoky A TZ 01.2 - Uliční stoky v povodí stoky A2 TZ 01.6 - Přeložky sítě technického vybavení (stoka A2) TZ 02.2 - Příjezdová komunikace, zpevnění plochy stoka A a stoka A2	Oprava komunikací v povodí stoky A a stoky A2	návrh 10.6.2022	3 705 503,68	0,00	-3 705 503,68	3 705 503,68	3 705 503,68							
CELKEM změna RN vlivem uzatlených změn				4 517 568,30	9 359 128,03	4 841 559,73	13 876 696,33	12 925 026,23	0,00	951 670,10	951 670,10	951 670,10	0,00	951 670,10	951 670,10
LIMITY podle § 222 ZVZ				Kč		přívodní hodnota závazku									
REZERVA (zbývající do vykterpání LIMITŮ díle ZVZ)				Kč		% terkpaní									
NOVÁ CENA vč. změn (zbývající do vykterpání LIMITŮ díle ZVZ)				Kč		92 633 579,99									
						26 337 606,08									
						25 385 935,98									
