

**Smlouva o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**

Číslo smlouvy objednatele: 2013126T

Číslo smlouvy zhotovitele: 12339/03

uzavíraná níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany:**

- (1) **Liberecký kraj**  
Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  
IČ: 70891508  
DIČ: CZ70891508  
Zastoupený: Martinem Půtou – hejtmánem

který na základě Mandátní smlouvy č.OLP/326/2011 zastupuje:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) **Chládek & Tintěra, a.s.**  
se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice  
IČ: 62743881  
DIČ: CZ62743881  
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706  
Za kterou jedná: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Ing. Stanislav Fousek, Vladimír Jehlička, Libuše Tintěrová, Ing. Pavel Stoulil, členové představenstva.  
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.  
bankovní spojení: KB, a.s., Litoměřice, č.ú.: 2053300217/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Strany**“

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce na zakázce „**Rekonstrukce mostu ev.č. 01016-2 - Ohrazenice**“.
2. Rozsah díla je určen:
  - a) Projektovou dokumentací pro provádění stavby včetně soupisu prací zpracovanou firmou EXprojekt s.r.o., IČ: 292 85 801, se sídlem Brno, Těsnohlídkova 943/9, PSČ 613 00, pod zakázkovým číslem 2012-037.
  - b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby
  - c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb.
  - d) Nabídkou zhotovitele ze dne 2. 5. 2013
  - e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28. 5. 2013
  - f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení lze stanovit cenu.

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující činnosti a listiny:
  - Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.
  - Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu (včetně označení a zaměření hranic pozemků). Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v termínu a počtu paré dle potřeb investora.
  - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních řádů, havarijních řádů, povodňových plánů, apod. V případě inženýrských sítí je součástí vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
  - Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) a zanesení do systému BMS.
  - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí:
    - náklady spojené s přípravou a realizací stavby
    - náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště
    - staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a

- s tím spojených nákladů s odstavkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození
  - kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby
  - dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.)
  - Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.
  - Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).
  - Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.
  - Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do předání díla.
  - Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.
  - Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace v požadovaném počtu paré (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu.
  - Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:
    - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě
    - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě
    - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě
    - archeologický dohled (fakturace dle prokazatelných nákladů, vyčíslených zpracovatelem)
    - geotechnický monitoring (fakturace dle prokazatelně provedených prací, odsouhlasených dozorem objednatele - TDI)
    - doplňující geotechnický průzkum (fakturace dle prokazatelně provedených prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)
    - zkoušení konstrukcí a prací
4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit sjednanou cenu.
5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.
6. Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní zadávací dokumentace dle odst. 2 písm. c) tohoto článku byla uveřejněna na profilu Objednatele na internetové adrese [www.stavebnionline.cz/Profil/KSSLK](http://www.stavebnionline.cz/Profil/KSSLK), je Zhotoviteli známa a takto mu byla i předána ve smyslu § 4 odst. 1 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

## *II. Termín provádění díla*

### 1. Zahájení realizace předmětu díla:

Termín předání a převzetí staveniště: do 1 dne od výzvy Objednatele, nejpozději však do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Předáním a převzetím staveniště dochází k zahájení realizace předmětu díla.

Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště.  
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno Objednatelem Zhotoviteli ve stavu, který umožňuje zahájit, provádět a dokončit dílo.

2. Dílo bude dokončeno a řádně předáno nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení realizace předmětu díla (předání a převzetí staveniště) do ukončení (protokolární předání stavby) realizace předmětu díla, nesmí však překročit 15.9.2013. V případě, že by tato lhůta uplynula po 15.9.2013, musí být dílo dokončeno a řádně předáno nejpozději do 15.9.2013.
3. Dílo bude prováděno dle časového plánu výstavby - časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Není-li v časovém plánu výstavby - časovém harmonogramu stanovena kratší lhůta, je Zhotovitel povinen zprůjezdnit most nejpozději do 65 kalendářních dnů od zahájení realizace předmětu díla. V případě, že by tato lhůta uplynula po 31.8.2013, platí, že most musí být zprůjezdněn nejpozději do 31.8.2013.
5. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy uskutečněné v písemné podobě a z důvodů uvedených v této smlouvě.
6. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je Zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku.
8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po kterou Zhotovitel na základě pokynu Objednatele podle předchozího odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlídně. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.

### *III. Cena díla*

#### **1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:**

Cena bez DPH **3 801 533,- Kč** (slovy tři milióny osm set jedna tisíc pět set třicet tři korun českých)

DPH 21% **798 322,- Kč** (slovy sedm set devadesát osm tisíc tři sta dvacet dva korun českých)

Cena včetně DPH **4 599 855,- Kč** (slovy čtyři milióny pět set devadesát devět tisíc osm set padesát pět korun českých)

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.
4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele.
5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

- Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy.
- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.
  - Pro toto dílo se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti. Na fakturách bude vyčíslena DPH. Objednatel pořizuje přijaté zdanitelné plnění výhradně pro plnění, které není předmětem daně, objednatel v tomto případě není v postavení osoby povinné k dani.

#### *IV. Platební podmínky*

- Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem.
- V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro Objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem a technickým dozorem investora. Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která Zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem a technickým dozorem investora je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci.
- Faktury vystavené Zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu (stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy.
- Faktury jsou splatné ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu:

#### **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je:

#### **Liberecký kraj**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| se sídlem:        | U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2       |
| zastoupený:       | Martinem Půtou, hejtmanem             |
| IČ:               | 708 915 08                            |
| DIČ:              | CZ708 915 08                          |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Liberec |
| číslo účtu:       | 19 – 7964200287/0100                  |

- Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručení opravené faktury Objednateli.
- V průběhu stavebních prací bude zhotovitel vystavovat měsíční faktury za oprávněně provedené práce. Před dokončením celého díla bude vyfakturováno pouze 90% z celkové

ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla tvoří pozastávku. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury.

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele.
8. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla má Zhotovitel právo na úrok z prodlení v zákonné výši.
9. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

### *V. Podklady pro provedení díla*

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro provedení díla Objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby a bez zbytečného odkladu objednatelé písemně upozornit na jejich vady.
3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla.

### *VI. Místo a způsob provádění díla*

1. Místem plnění je rekonstrukce mostu ev č. 01016-2 Ohrazenice.
2. O předání staveniště Zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí Zhotovitelem, vytyčení základních směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
4. Rozsah zařízení staveniště, jeho uvažované umístění a připojení na síť bude předložen k odsouhlasení Objednateli.
5. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení Objednatele.
6. Materiál odstraněný při provádění díla (např. frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví Libereckého kraje a Zhotovitel je povinen tento materiál předat Objednateli. Objednatel se prostřednictvím stavebního dozoru vyjádří, zda-li materiál požaduje ponechat či zda jej má Zhotovitel vlastním nákladem odvézt a zlikvidovat.

7. Do pěti dnů od předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat vyklizené staveniště v odpovídajícím stavu. Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak Zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí.
8. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuelní škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na náklady Zhotovitele, a to před předáním staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí a podle pokynů Objednatele.

### *VII. Součinnost účastníků výstavby*

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy.

### *VIII. Stavební deník*

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.
2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

### *IX. Jakost a provedení díla*

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny Objednatele při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleň v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací stavby zodpovídá v průběhu prací Zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby.
6. Před zahájením provádění díla předloží Zhotovitel Objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

### *X. Kontrola provádění díla*

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směřem ke zhotoviteli v technických věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani žádným jiným způsobem zavazovat objednatele. K vykonání takové kontroly má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, technický dozor u stavby nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.
3. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele v průběhu provádění díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, polotovary a ostatní dodávky určené touto smlouvou o dílo, popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, eventuálně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci je Zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla Objednatel.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

## *XI. Zkoušky díla*

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek díla.
3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

## *XII. Prodlení při provádění díla*

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy.

## *XIII. Změny díla*

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením takové změny.

## *XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo*

1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal dílo s vadami,

přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.

### *XV. Projektová dokumentace*

1. Pokud bude výkaz výměr stavby odlišný od výkazu výměr v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit ke schválení změnové listy. Změnové listy musí obsahovat popis a zdůvodnění změny a budou vyhotoveny na formulářích dle standardu Objednatele.
2. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a jedenkrát v elektronické podobě v uzavřené i otevřené digitální formě. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu \*.doc - Microsoft Word 2000, obrázky \*.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. Uzavřená forma bude uložena ve formátu \*.pdf.

### *XVI. Předání a převzetí díla*

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel alespoň pět dnů před zápisem ve stavebním deníku.
2. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě zápisu o předání a převzetí díla potvrzeného objednatel, zhotovitelem a technickým dozorem investora.
3. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatel a zhotovitele o právech objednatel z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.
4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.
5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řady a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.
6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatel v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

## *XVII. Odpovědnost za vady*

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu **60 měsíců** od předání a převzetí díla.
2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady.
3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode dne oznámení vady zhotoviteli.
4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.
5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

## *XVIII. Smluvní pokuty*

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

## *XIX. Odstoupení od smlouvy*

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než dvacet dnů.

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil.

## *XX. Oprávněné osoby*

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat:
  - a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka, 733 728 956
  - b) externí TDI – Ing. Lubomír Bureš – IBH Kladno, 733 728 956
  - c) mostmistr, KSS LK - Jaroslav Bakeš, 724 631 401
  - d)) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522)
2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat:
  - a) Vladimír Jehlička, ředitel závodu mostních staveb, tel. 606 628 968
  - b) Martin Suchan, vedoucí výroby mostních staveb, tel. 602 621 431
  - c) Ing. Robert Frost, hlavní vedoucí stavby, tel. 602 185 617
  - d) Ing. Jan Vintrich, zástupce hlavního vedoucího stavby, tel. 602 525 796
  - e) Zdeněk Anderka, stavbyvedoucí, tel. 602 585 498
3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně smlouvy.

## *XXI. Subdodavatelé*

1. Zhotovitel provádí dílo sám nebo prostřednictvím subdodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v souvisejícím zadávacím řízení svou kvalifikaci pouze se souhlasem Objednatele a jen tehdy, pokud bude nový subdodavatel splňovat veškeré podmínky kvalifikace, které splňoval předcházející subdodavatel. Ostatní subdodavatele je Zhotovitel oprávněn změnit pouze se souhlasem Objednatele.
3. Zhotovitel výslovně bere na vědomí povinnosti vyplývající z § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## *XXII. Pojištění*

1. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřel platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním stavby. Výše pojistného plnění v uvedené pojistné smlouvě musí být stanovena minimálně ve výši 5.000.000,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu udržovat v plném rozsahu po celou dobu trvání této smlouvy.

### *XXIII. Obchodní tajemství*

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.
2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla.
3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby.
4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

### *XXIV. Oddělitelnost*

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
2. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.

### *XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení*

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle českých právních předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 7 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 5 výtisků a zhotovitel 2 výtisky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují.
6. Smlouva nabývá v účinnosti v den podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí finančních prostředků z dotačních programů, do nichž podal žádost na předmětnou akci.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
- a) Příloha č. 1 – časový plán výstavby - časový harmonogram
  - b) Příloha č. 2 – oceněný soupis prací a souhrnný list stavby
  - c) Příloha č. 3 – seznam subdodavatelů

V Liberci, dne

24.6.2013

V Litoměřicích, dne 17. 06. 2013



.....  
za objednatele:


Ing. Jan Růžička, ředitel  
Krajská správa silnic Libereckého kraje,  
příspěvková organizace



.....  
za zhotovitele:

Ing. Pavel Stoulil,  
člen představenstva

Krajská správa silnic  
Libereckého kraje,  
příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
460 06 Liberec VI (512)



.....  
za zhotovitele:

Ing. Stanislav Fousek,  
člen představenstva

Proveďte a doporučte k podpisu:

Podpis

Datum

17. 6. 2013



Chládek & Tintěra a.s.  
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice  
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669  
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881  
www.cht.cz  
- 100 -



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Ohrazenice rekonstrukce mostu ev.č. 01016-2                                      |                 |
| Číslo stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                  |                 |
| Investor (objednatel):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Liberecký kraj / Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace |                 |
| Projektant (zpracovatel):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | EXprojekt s.r.o.                                                                 |                 |
| Zhotovitel stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                  |                 |
| CÚ/Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 2011/ASPE                                                                        |                 |
| Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                  |                 |
| Název souhrnných částí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Cena (Kč)                                                                        |                 |
| A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Cena bez DPH (Kč)                                                                | Cena s DPH (Kč) |
| Číslo objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Název objektu      | Cena bez DPH (Kč)                                                                | Cena s DPH (Kč) |
| SO201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Most ev.č. 01016-2 | 3 675 603                                                                        | 4 447 480       |
| STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 3 675 603                                                                        | 4 447 480       |
| B Technologická část stavby (provozní soubory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Cena bez DPH (Kč)                                                                | Cena s DPH (Kč) |
| Číslo souboru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Název souboru      | Cena bez DPH (Kč)                                                                | Cena s DPH (Kč) |
| PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | neoceňuje se                                                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                  |                 |
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 0                                                                                | 0               |
| C Projektová dokumentace pro realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Cena bez DPH (Kč)                                                                | Cena s DPH (Kč) |
| Název dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Cena bez DPH (Kč)                                                                | Cena s DPH (Kč) |
| Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) - Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č.5. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).                                                                                  |                    | Kč                                                                               | neoceňuje se    |
| Dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č.6. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). |                    | Kč                                                                               | 16 000 19 360   |
| Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu do BMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Kč                                                                               | 10 000 12 100   |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 26 000                                                                           | 31 460          |
| D Zeměměřická měření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Cena bez DPH (Kč)                                                                | Cena s DPH (Kč) |
| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Cena bez DPH (Kč)                                                                | Cena s DPH (Kč) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |              |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | Kč           | 16 000            | 19 360           |
| Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Kč           | 8 000             | 9 680            |
| <b>ZEMĚMĚRICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |              | <b>24 000</b>     | <b>29 040</b>    |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Náklady na umístění stavby |              | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)  |
| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |              | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)  |
| <b>Náklady na umístění stavby:</b> <span style="float: right;">Technická specifikace:</span> Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.<br>Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. |                            | Kč           | 67 930            | 82 195           |
| <b>NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |              | <b>67 930</b>     | <b>82 195</b>    |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ostatní náklady            |              | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)  |
| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |              | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)  |
| <b>Publicita</b><br>– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | neoceňuje se |                   |                  |
| Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |              |                   |                  |
| - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Kč           | 4 000             | 4 840            |
| - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | Kč           | neoceňuje se      |                  |
| - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Kč           | neoceňuje se      |                  |
| - archeologický dohled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Kč           | 4 000             | 4 840            |
| - záchranný archeologický průzkum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Kč           | neoceňuje se      |                  |
| - geotechnický monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Kč           | neoceňuje se      |                  |
| - doplňující inženýrsko geologický průzkum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Kč           | neoceňuje se      |                  |
| Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | neoceňuje se |                   |                  |
| <b>OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |              | <b>8 000</b>      | <b>9 680</b>     |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |              | <b>3 801 533</b>  | <b>4 599 855</b> |

**POZNÁMKA:** Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

## Rozpočet stavby

Stavba : Ohrazení rekonstrukce mostu ev.č. 01016-2  
 číslo a název SO: SO 01 - Most ev.č. 01016-2  
 číslo a název rozpočtu: SO 01 - Most ev.č. 01016-2

| Poř. č. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                        | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                  |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------------|
|         |             |                                                                                                                                                                      |          |                | jednotková | celkem           |
| 1       | 2           | 3                                                                                                                                                                    | 4        | 5              | 6          | 7                |
| 0       |             | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                  |          |                |            |                  |
| 1       | 14102       | POPLATKY ZA SKLÁDKU, POPLATKY ZA ZEMNÍK výkopy - hloubení jam * 1,8t/m <sup>3</sup>                                                                                  | T        | 466,992        | 18,00      | 8 405,86         |
| 2       | 14202       | POPLATKY ZA ZEMNÍK ornice pro ohumusování - 300m <sup>2</sup> *0,15m*1,8t/m <sup>3</sup> =81t                                                                        | T        | 81,000         | 93,00      | 7 533,00         |
| 3       | 2730        | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zabezpečení stávajících IS proti poškození (vyvěšení vedení VO mimo most - platí pro SO 01                    | KPL      | 1,000          | 5 181,00   | 5 181,00         |
| S       | 0           | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                  |          |                |            | <b>21 119,86</b> |
| 1       |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                   |          |                |            |                  |
| 4       | 113728      | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vrchní vrstva vozovky na objízdné trase vč. odvozu, uložení na sklad KSS LK 7000m <sup>2</sup> *0,05m=350m <sup>3</sup> | M3       | 350,000        | 750,00     | 262 500,00       |
| 5       | 125118      | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 20KM natěžení ornice pro ohumusování - 300m <sup>2</sup> *0,15m=45m <sup>3</sup>                                  | M3       | 45,000         | 28,00      | 1 260,00         |
| 6       | 12571       | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 materiál pro dosypávku krajnic                                                                                                 | M3       | 2,250          | 207,00     | 465,75           |
| 7       | 131718      | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 20KM nevhodný výkop na skládce vč. zapažení a rozeptání 5,7m*4,7m*12m-1,1m*4,7m*12=259,44m <sup>3</sup>               | M3       | 259,440        | 94,00      | 24 387,36        |
| 8       | 17120       | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUT materiál z výkopů na skládce                                                                                                    | M3       | 259,440        | 11,00      | 2 853,84         |
| 9       | 17310       | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT v místě rekonstrukce vozovky - ŠD 0,9m*25m*0,1m=2,25m <sup>3</sup>                                                                | M3       | 2,250          | 351,00     | 789,75           |
| 10      | 17481       | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp základů a kuželů - nakoupený nenamrzavý materiál vhodný do zásypů vč. natěžení a dovozu - 6m*4m*2m=48m <sup>3</sup>   | M3       | 48,000         | 258,00     | 12 384,00        |
| 11      | 18120       | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 5 zlepšení základové spáry zahutněním ŠD 11,1m*8,4m=93,24m <sup>2</sup>                                                                | M2       | 93,240         | 73,00      | 6 806,52         |
| 12      | 18214       | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M úprava terénu v okolí mostu po dokončení stavby                                                                         | M2       | 300,000        | 20,00      | 6 000,00         |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |            |            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
| 13 | 18223   | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M<br>ohumusování                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 300,000 | 42,00      | 12 600,00  |
| 14 | 18241   | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 300,000 | 22,00      | 6 600,00   |
| 15 | 183511  | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 300,000 | 3,50       | 1 050,00   |
| 16 | 18600   | ZALÉVÁNÍ VODOU<br>3x opakovaná závlhka 27m3/ha t.j. 2,7 l/m2 x 3 = 8,0 l/m2                                                                                                                                                                                                                                                            | M3  | 2,400   | 56,00      | 134,40     |
| S  | 1       | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |            | 337 831,62 |
| 17 | 212642  | 2 Základy<br>TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 3-4<br>odvodnění rubu klenby tr. děrovanými DN 150 vč. event. obalení drenážního potrubí<br>geotextilií nebo obetonováním drenážním betonem, vyvedení drenáže křídly do boků násypů<br>z trub plných vč. podsypu ŠP a ukončujícího objektu (kapličky)<br>2*10m=20m | M   | 20,000  | 173,00     | 3 460,00   |
| 18 | 272324  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)<br>37,9m2*0,8m=30,32m3                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 30,320  | 2 908,00   | 88 170,56  |
| 19 | 272365  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T   | 1,910   | 21 154,00  | 40 404,14  |
| 20 | 28997   | ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE<br>ochrana rubu ocelové trouby<br>14,9m*11,5m=171,35m2                                                                                                                                                                                                                                                          | M2  | 171,350 | 51,00      | 8 738,85   |
| S  | 2       | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |            | 140 773,55 |
| 21 | 317325  | 3 Svislé konstrukce<br>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)<br>římasy vč. ukotvení do stávající i nové poprsní zídky, vč. výplně a těsnění pracovních a<br>dilatačních spar<br>0,57m2*(12,5+1,37)m=7,906m3                                                                                                                            | M3  | 7,906   | 5 764,00   | 45 570,18  |
| 22 | 317365  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T   | 0,451   | 21 154,00  | 9 540,45   |
| 23 | 333324  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)<br>nové vtokové čelo<br>(49,8-15,5)m2*0,8m+4,8m2*1,4m=34,16m3                                                                                                                                                                                                               | M3  | 34,160  | 4 817,00   | 164 548,72 |
| 24 | 333365  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T   | 2,070   | 21 154,00  | 43 788,78  |
| S  | 3       | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |            | 263 448,13 |
| 25 | 421942a | 4 Vodorovné konstrukce<br>MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 37<br>ocelová konstrukce MultiPlate MP200 typ VN13, včetně PKO a nátěru dle PD                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,000   | 560 122,00 | 560 122,00 |
| 26 | 451313  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20<br>pod novými operami a křídly<br>4,1m*0,1m*1,5m=0,615m3                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 0,615   | 2 232,00   | 1 372,68   |

|    |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |          |                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------------|
| 27 | 45852   | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA<br>zásyp nosné konstrukce - přechodové klíny<br>54,5m2*11,4m=621,3m3                                                                             | M3  | 621,300 | 359,00   | 223 046,70          |
| 28 | 465512  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>zpevnění za římsami z lom. kamene tl. 200 mm vč. betonového lože tl. 150 mm, nové koryto<br>pod mostem<br>27,7m2*0,35m+3,78m2*13,3m=59,969m3      | M3  | 59,969  | 2 338,00 | 140 207,52          |
| S  | 4       | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                         |     |         |          | <b>924 748,90</b>   |
|    | 5       | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                   |     |         |          |                     |
| 29 | 561432  | KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM<br>SC 0/32 C5/6 (MZKC II) v tl. 150 mm - 2. podkladní vrstva na mostě a předpoli<br>22,8m*7,9m=180,12m2                                    | M2  | 180,120 | 201,00   | 36 204,12           |
| 30 | 56333   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM<br>ŠDA tl. 150 mm - 3. podkladní vrstva na mostě a předpoli<br>21,6m*7,9m=170,64m2                                                       | M2  | 170,640 | 67,00    | 11 432,88           |
| 31 | 572214  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>plocha na mostě<br>195,92m2+188,02m2=383,94m2                                                                                     | M2  | 383,940 | 16,00    | 6 143,04            |
| 32 | 574141  | ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM<br>ACO 11+ (ABS I) - obrusná vrstva na mostě a předpoli<br>24,8m*7,9m=195,92m2                                                                         | M2  | 195,920 | 261,00   | 51 135,12           |
| 33 | 574141a | ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM<br>ACO 16+ (ABH I) - ložná vrstva na mostě a předpoli<br>24,8m*7,9m=195,92m2                                                                           | M2  | 195,920 | 212,00   | 41 535,04           |
| 34 | 574621  | OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM<br>ACP 22+ (OK I) v tl. 100 mm - 1. podkladní vrstva na mostě a předpoli<br>23,8m*7,9m=188,02m2                                                 | M2  | 188,020 | 425,00   | 79 908,50           |
| 35 | 577401  | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU<br>DIO - oprava objízdné trasy - vyspravení povrchu vozovky vč. řezání asf. Krytu a<br>spojovacího postřiku<br>7000m2*0,05m=350,00m3      | M3  | 350,000 | 4 250,00 | 1 487 500,00        |
| S  | 5       | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                   |     |         |          | <b>1 713 858,70</b> |
|    | 7       | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                   |     |         |          |                     |
| 36 | 711111  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY<br>nátěr betonu ve styku se zeminou<br>50m2+3m*13m2=89m2                                                         | M2  | 89,000  | 61,00    | 5 429,00            |
| 37 | 711117  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLII<br>volně ložený izolační sendvič - geotextilie 600g/m2 - izolace HDPE folii - geotextilie<br>600g/m2; 9,5m*2*9m=171,00m2 | M2  | 171,000 | 235,00   | 40 185,00           |
| 38 | 711127a | PE FÓLIE PRO ZAKRYTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ<br>DIO - provizorní zakrytí svislé dopravní značky páskou - zřízení a odstranění                                                   | KUS | 15,000  | 41,00    | 615,00              |

|    |        |                                                                                                                                                                                            |     |        |          |           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 39 | 742813 | PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNIČKY<br>zpětné uložení kabelu VO do chráničky v římsě vč. napojení na stávající rozvod, event.<br>nastavení kabelu při nedostatečné délce kabelu stávajícího | M   | 13,000 | 41,00    | 533,00    |
| 40 | 78383  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C<br>pružný polymerní povlak na římsě<br>0,5m*12,24m=6,12m2                                                                                                   | M2  | 6,120  | 194,00   | 1 187,28  |
| 41 | 78386  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - E<br>uzavírací nátěr na betonu<br>12,3m*1,56m+26m2=45,188m2                                                                                                   | M2  | 45,188 | 194,00   | 8 766,47  |
| S  | 7      | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                 |     |        |          | 56 715,75 |
|    | 8      | Potrubí                                                                                                                                                                                    |     |        |          |           |
| 42 | 87626  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM<br>chránička v římsě a pod zámkovou dlažbou za římsou pro kabel VO vč. zatahovacích prvků,<br>vč. úpravy podloží                                         | M   | 13,500 | 83,00    | 1 120,50  |
| S  | 8      | Potrubí                                                                                                                                                                                    |     |        |          | 1 120,50  |
|    | 9      | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                 |     |        |          |           |
| 43 | 911115 | OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM<br>lankové zábradlí na výtakovém čele<br>2,05m*2+3m=7,1m                                                                              | M   | 7,100  | 2 332,00 | 16 557,20 |
| 44 | 911215 | OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM<br>0,49m+1,75m+1,7m*3+1,8m*2+0,81m+0,75m+0,2m=12,7m                                                                                   | M   | 12,700 | 4 100,00 | 52 070,00 |
| 45 | 911315 | OCEL SIL SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍK KOV S NÁTĚR<br>8,4m+34,6m=43,00m                                                                                                           | M   | 43,000 | 1 545,00 | 66 435,00 |
| 46 | 91345  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ                                                                                                                                                                    | KUS | 2,000  | 855,00   | 1 710,00  |
| 47 | 91355  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU<br>dodávka a montáž tabulky s číslem mostu                                                                                                                           | KUS | 2,000  | 1 886,00 | 3 772,00  |
| 48 | 914124 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT<br>DIO - provizorní vč. sloupků a patek, vč. dovozu a odvozu                                                                  | KUS | 22,000 | 2 096,00 | 46 112,00 |
| 49 | 915211 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                          | M2  | 11,250 | 466,00   | 5 242,50  |
| 50 | 916314 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ<br>DIO - provizorní vč. sloupků a patek, vč. dovozu a odvozu                                                                      | KUS | 2,000  | 1 140,00 | 2 280,00  |
| 51 | 91731  | ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT<br>obrubníky vč. bet.lože - lem zpevnění za římsami na styku s vozovkou<br>1,9m+0,65m=2,55m                                                                  | M   | 2,550  | 147,00   | 374,85    |
| 52 | 91732  | CHODNÍK OBRUBY BETON MONOLIT<br>obrubníky vč. bet.lože - lem zpevnění za římsami na styku s vozovkou                                                                                       | M   | 2,000  | 288,00   | 576,00    |
| 53 | 931325 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2<br>těsnění zálivky podél římsy                                                                                                    | M   | 3,200  | 155,00   | 496,00    |
| 54 | 93135  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM<br>přetěsnění zálivky podél římsy                                                                                                      | M   | 12,300 | 155,00   | 1 906,50  |

|    |         |                                                                                                                       |     |        |          |                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| 55 | 936315a | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37)<br><i>leťopočet rekonstrukce mostu např. výšem do betonu římsy</i> | KUS | 1,000  | 1 554,00 | 1 554,00            |
| 56 | 969R    | ODSTRANĚNÍ OBCHOZÍ TRASY na výtoku mostu                                                                              | M   | 60,000 | 89,00    | 5 340,00            |
| 57 | 11525   | včetně uložení na skládku<br>PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M<br>Vč. těsnící hrázky             | M   | 17,000 | 680,00   | 11 560,00           |
| S  | 9       | Ostatní konstrukce a práce                                                                                            |     |        |          | 215 986,05          |
|    |         | <b>C e l k e m</b>                                                                                                    |     |        |          | <b>3 675 603,06</b> |
|    |         |                                                                                                                       |     |        |          |                     |

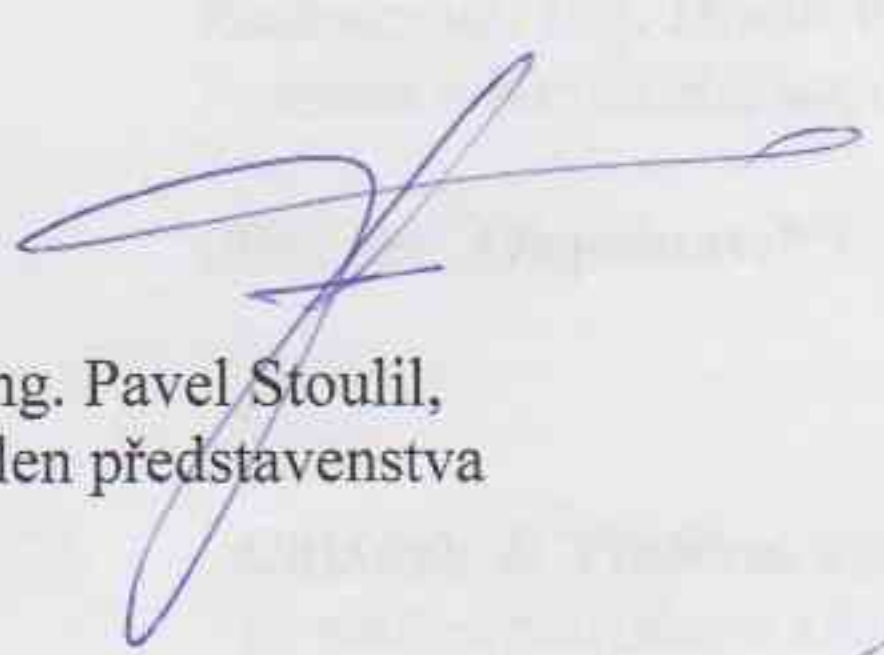
### Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

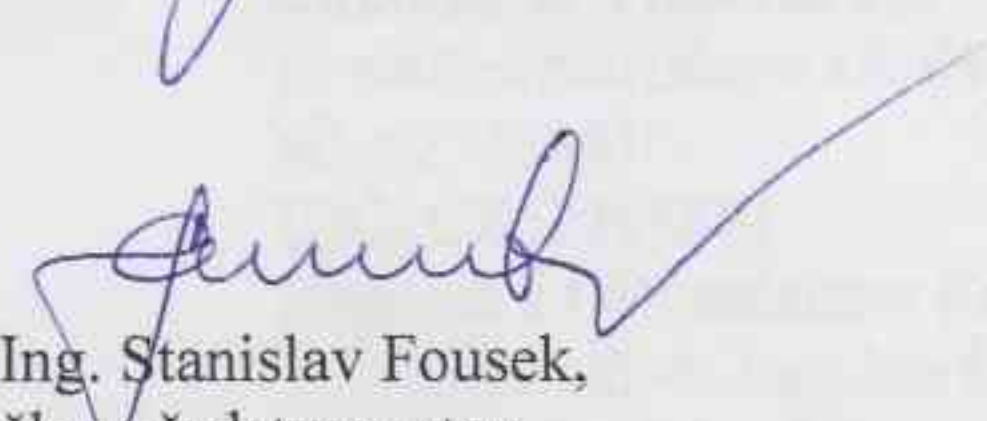
Zhotovitel provádí dílo prostřednictvím následujících subdodavatelů:

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ing. Jiří Mlejnecký, Žitná 90, 403 31 Ústí n.L., IČ: 86706748            |                      |
| Část veřejné zakázky plněná prostřednictvím subdodavatele :              | 0,5 %                |
| Stručný popis části veřejné zakázky, která bude plněna subdodavatelsky : | zeměměřičská činnost |

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ing. Radek Brokl, Lidické nám. 34, 506 01 Jičín – Nové Město, IČ: 66426219 |                      |
| Část veřejné zakázky plněná prostřednictvím subdodavatele :                | 0,5 %                |
| Stručný popis části veřejné zakázky, která bude plněna subdodavatelsky :   | geotechnická činnost |

V Litoměřicích, dne 17. 06. 2013

  
Ing. Pavel Stoulil,  
člen představenstva

  
Ing. Stanislav Fousek,  
člen představenstva



**Chládek & Tintěra a.s.**  
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice  
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669  
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881  
www.cht.cz  
- 100 -

príspevková organizácia  
Česke mládeže 632/32  
460 06 Liberec VI (512)

460 06 Liberec VI (512)
