

Reg. č. D/0143/2013/ŘDP/2

DODATEK Č. 2

č. objednatele: D/0143/2013/ŘDP/2

č. zhotovitele: 2013-003-INT

SMLOUVY O NAsAZENÍ IDENTITY MANAGEMENT SYSTÉMU, PROVEDENÍ VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU A O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY DODANÝCH SYSTÉMŮ

uzavřené na základě ust. § 269 odst. 2 a podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel: Zlínský kraj
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmánem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800

a

Zhotovitel: Corpus Solutions a.s.
Adresa sídla: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
IČ: 25764616
DIČ: CZ25764616
Zapsaný v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5936
Zastoupený: Ing. Martinem Pavlicou, členem představenstva
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 69474001/5500

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi shora uvedenými smluvními stranami

t a k t o :

Článek I. Úvodní prohlášení

1. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že uzavřely dne 13. 2. 2013 smlouvu o nasazení identity management systému, provedení vnitřní integrace úřadu a o zajištění podpory dodaných systémů, ve znění jejího dodatku č. 1, uzavřeného dne 13. 2. 2013 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je provedení dodávky a implementace identity management systému a provedení vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje a zajištění podpory jeho provozu.
2. Předmětem tohoto dodatek č. 2 Smlouvy je úprava délky trvání fáze č. 1 – „Zahájení plnění a zpracování implementační dokumentace“ ze 7 týdnů na 10 týdnů na úkor fáze č. 2 – „Dodávka a implementace díla, která bude tímto zkrácena. Posunutí termínu jednotlivých fází nemá vliv na cenu díla ani termín ukončení projektu. Důvodem k této změně je skutečnost, že oproti původním předpokladům v roce 2012 (kdy byla Smlouva a jí předcházející veřejná zakázka připravována):
 - nebyl dosud dokončen projekt Jednotného identitního prostoru veřejné správy,
 - nebyla dosud zpracována pravidla komunikace Krajského úřadu Zlínského kraje se zřizovanými a zakládanými organizacemi Zlínského kraje,

v důsledku čehož nebyla vyřešena řada dalších s tím souvisejících problémů. Vzhledem k této skutečnosti je potřeba, aby bylo pro zpracování implementační analýzy (dokumentace), která je součástí fáze č. 1, poskytnuto více času.

3. S ohledem na objektivní důvod uvedený v odstavci 2 tohoto článku, se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu plnění, uvedeného v odstavci 1 článku II Smlouvy a uvedeného v příloze č. 5 Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.
4. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v článku II. tohoto dodatku není s ohledem na výše uvedený objektivní důvod podstatnou změnou práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu odst. 7 § 82 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II. Předmět dodatku – změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka uvedená v odstavci 1 článku II Smlouvy se mění a nově zní takto:

Fáze	Obsah plnění	Lhůta plnění
fáze 1 - zahájení plnění a zpracování implementační dokumentace	zhotovitel zahájí plnění	ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
	zhotovitel zpracuje a předá objednateli řádně dokončenou „implementační dokumentaci“	do 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
	akceptace části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 1	k datu dokončení fáze 1
fáze 2 - dodávka a implementace díla	zhotovitel provede dodávku a implementaci IDM a IB	do 4 měsíců od dokončení fáze 1
	akceptace části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 2	k datu dokončení fáze 2
fáze 3 - testovací provoz	zhotovitel provede testovací provoz díla	do 1 měsíce od dokončení fáze 2
	akceptace části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 3	k datu dokončení fáze 3
fáze 4 - zkušební provoz	zhotovitel provede zkušební provoz díla	do 6 týdnů od dokončení fáze 3, nejdéle však do 30. 11. 2013
	zhotovitel provede školení uživatelů	do 5 týdnů od dokončení fáze 3, nejdéle však do 15. 11. 2013
	zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky zjištěné v průběhu zkušebního provozu	nejpozději k datu dokončení fáze 4
	zhotovitel opraví/doplní provozní dokumentaci (tj. dokumentaci dodaného IDM a IB), pokud si to vyžádají zjištění učiněná v průběhu zkušebního provozu a kompletní PD předá objednateli	nejpozději k datu dokončení fáze 4
	předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků - vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla	k datu dokončení fáze 4, nejpozději však k 31. 12. 2013
fáze 5 - podpora díla	zhotovitel zajistí podporu díla v průběhu jeho běžného provozu	od dokončení fáze 4 do 31. 12. 2018

2. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 5 Smlouvy (Podrobný harmonogram plnění) se mění a nově zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Příloha č. 1 tohoto dodatku je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek si před jeho podpisem řádně přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 25.3.2013, 0280/R06/13

Ve Zlíně dne: - 9 -04- 2013

V Praze dne: 3.4.2013

za objednatele

za zhotovitele

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



Ing. Martin Pavlica
člen představenstva



Corpus Solutions a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
IČ: 25764616 DIČ: CZ25764616




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Příloha č. 1 dodatku

Příloha č. 5 smlouvy: Podrobný harmonogram plnění

V této příloze je v souladu s článkem II. odst. 2 smlouvy uveden podrobný harmonogram plnění ve formě Ganttova diagramu:

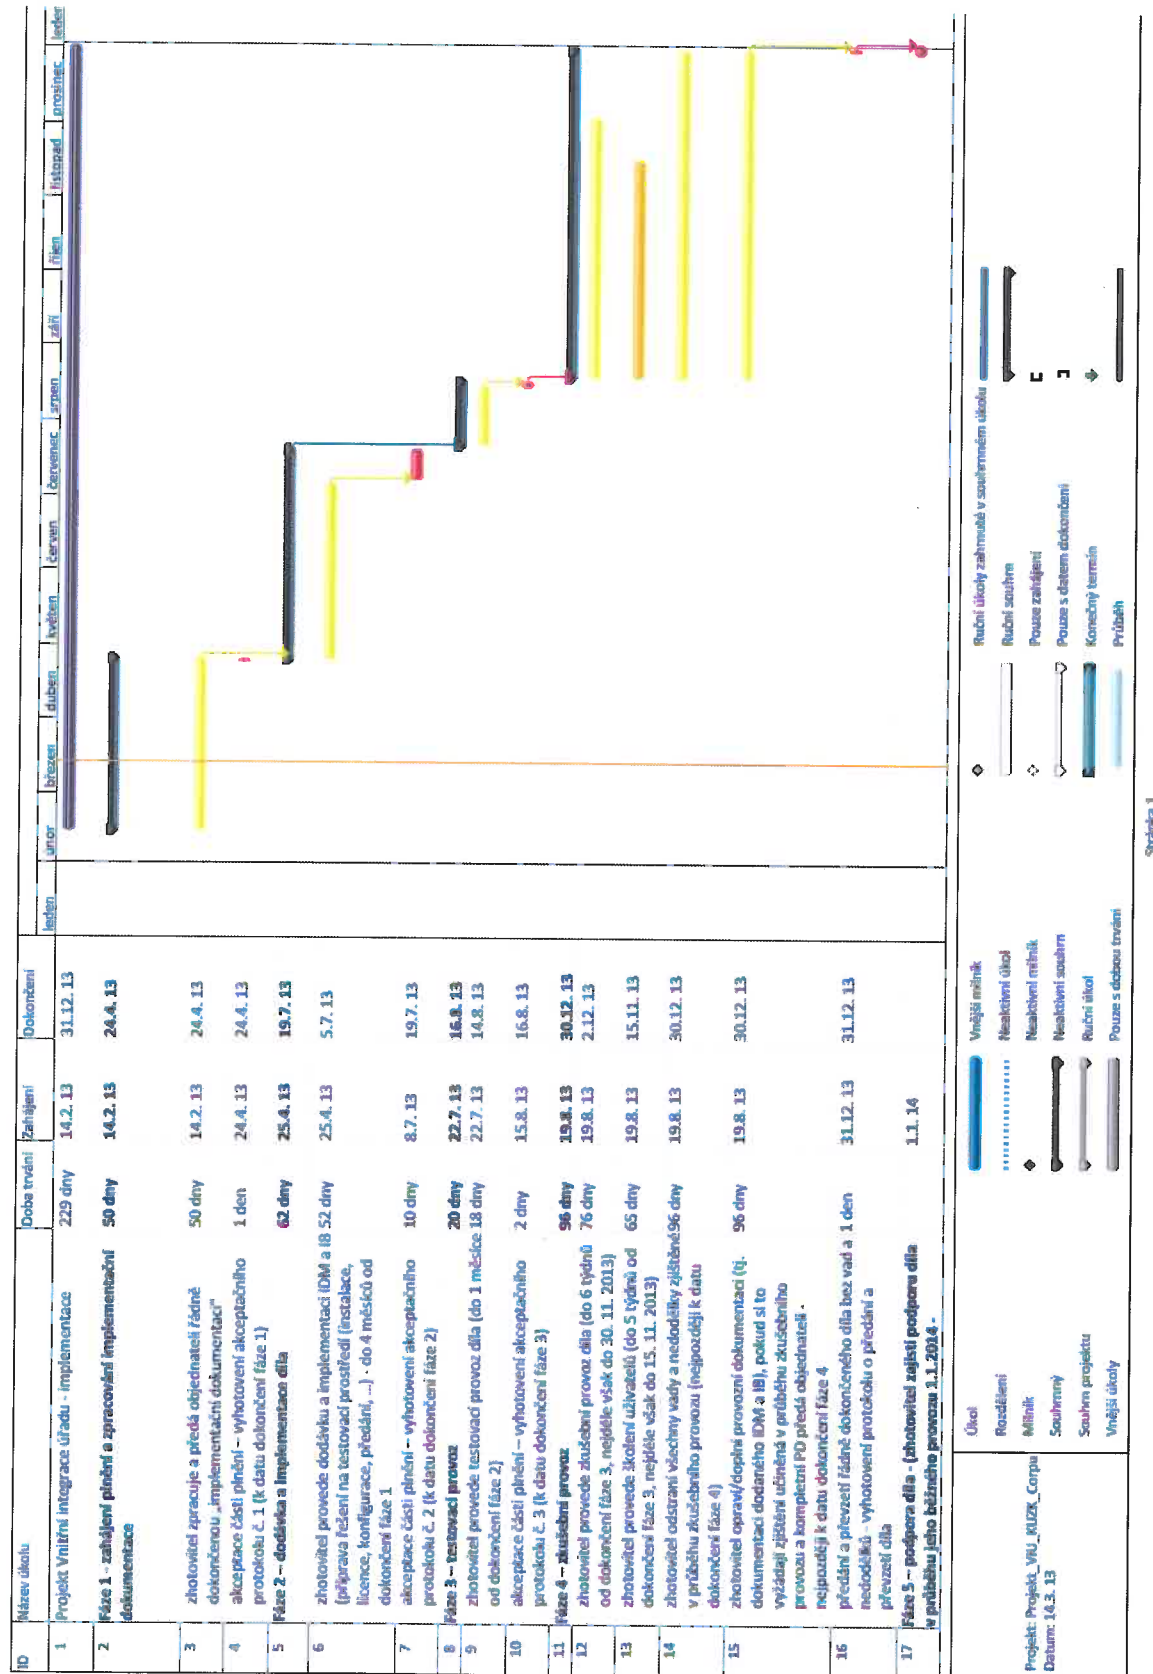

Oddor řízení dotačních programů 1



Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **46879103-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **130422143816**

do podoby elektronické, skládající se z **6** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 22.4.2013
