

Smlouva o dílo

veřejné zakázky na projektové práce a inženýrskou činnost

Stavba

1063 - Rek. rozvaděčů a kabel. kolektoru ČS Plav

Objednatel:

Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19
370 01 České Budějovice



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele : 1063/21/p0
Číslo smlouvy zhotovitele : SD000012827

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel :** Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
 ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
 ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek
dále také jen „objednatel“
- Zhotovitel :** I&C Energo a.s.
Pražská 684/49, 674 01 Třebíč
Spisová značka : B 4153 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený : Ing. Jiří Holinka, MBA - předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
 ve věcech smluvních : Mgr. Lucie Hendrychová, LL.M. - VO obchodu
 ve věcech technických : Ing. Jiří Kropáček - Ředitel řídicí divize
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu : 303110143/0300
IČO : 49433431
DIČ : CZ49433431
Číslo telefonu : (+420) 724 952 641
Email : lhendrychova@ic-energo.eu
ID datové schránky : z68csb6
dále také jen „zhotovitel“

dále také objednatel a zhotovitel dohromady jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“

- 1.2 Osoby oprávněné za **objednatele** jednat ve věci této smlouvy, konkrétně ve věcech technických :

Vladimír Sedláček - přípravář staveb, +420 608 609 168, sedlacek@jvs.cz

Pavel Chalupa - technik, +420 601 122 102, chalupa@jvs.cz

Jaroslav Gazda - územní inspektor, +420 602 697 527, gazda@jvs.cz

- 1.3 Osoby oprávněné za **zhotovitele** jednat ve věci této smlouvy, konkrétně ve věcech technických :

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Horáček

Pozice : Projekt manažer

Mobil : +420 606 619 797

Email : jhoracek@ic-energo.eu

2. PREAMBULE

- 2.1 Tato smlouva je uzavřena dle ustanovení občanského zákoníku upravujících smlouvu o dílo (§ 2586 a násl. občanského zákoníku); práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.2 Objednatel má v úmyslu realizovat stavbu s těmito výchozími údaji:
- a) Název stavby : Rek. rozvaděčů a kabel. kolektoru ČS Plav
 - b) Místo stavby : ÚV Plav
 - c) Investor : Jihočeský vodárenský svaz
 - d) Předpokládaná doba realizace : 10 měsíců
(dále také jen „stavba“)
- 2.3 Účelem této smlouvy je **zajištění projektových prací a inženýrské činnosti pro přípravu a při realizaci stavby** (dále také jen „účel smlouvy“).
- 2.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- a) **Příloha č. 1: „Výkony dle fází“**, ve které jsou specifikovány jednotlivé fáze přípravy a realizace stavby a s těmito jednotlivými fázemi související Zvolte položku. (dále také jen „Příloha č. 1“)
 - b) **Příloha č. 2: „Další výkony“**, ve které jsou specifikovány další výkony související s přípravou a realizací stavby (dále také jen „Příloha č. 2“)
 - c) **Příloha č. 3: „Autorský dozor“**, ve které je specifikována kalkulace nákladů na autorský dozor projektanta (dále také jen „Příloha č. 3“)

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje pro realizaci účelu této smlouvy za podmínek sjednaných v této smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

spočívající v provedení projektových prací a inženýrské činnosti,

**kteře jsou v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 ve sloupci „ANO/NE“ označeny „ANO“,
a to dle specifikace v odst. 2.2 až 2.4. tohoto článku této smlouvy
a dalších podmínek sjednaných touto smlouvou
(dále také jen „dílo“)**

- 3.2 Dílo bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy. Dílo musí být prováděno tak, aby stavba realizovaná na jeho základě splňovala všechny základní požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb stanovené obecně závaznými právními předpisy a požadavky na dodržení Zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Právními předpisy stanovujícími výše uvedené požadavky na danou stavbu jsou zejména (nikoliv však pouze):

- a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- b) Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
- c) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“)
- d) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
- e) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- f) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- g) Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů
- h) Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
- ch) Vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“)
- i) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
- j) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- k) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dále **přepisy týkající se BOZP** zejména (nikoliv však pouze):

- a) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- b) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- c) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek k BOZP
- d) Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- e) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dále **Zásadami sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací** se rozumí

a) požadavek, na nalezení ekonomicky přijatelných řešení, která umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky

b) požadavek, na nalezení ekonomicky přijatelných řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky

3.3 Při provádění díla bude zhotovitel respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů.

3.4 Provádění díla bude dle potřeby konzultováno s objednatelem.

3.5 **Projektové dokumentace**, které jsou součástí prováděného díla v rámci projektových činností, budou prováděny takto:

3.5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy.

Projektová dokumentace bude zpracována dle příslušných platných ČSN (tj. min. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) v částech závazných i směrných. Odchytky technického charakteru, které nejsou v rozporu s požadavky právních předpisů, musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem, resp. příslušným orgánem.

3.5.2 Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán Vyhláškou č. 499/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace bude grafická a textová část.

3.5.3 Součástí projektové dokumentace bude:

a) **oceněný položkový rozpočet** obsahující soupis prací, dodávek a služeb (pořadové číslo položky vzestupně v nepřerušené číselné řadě, číselné zařazení položky, popis položky, měrná jednotka, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému množství) oceněný dle, v době zpracování rozpočtu platné, Cenové soustavy ÚRS

b) **neoceněný položkový rozpočet** obsahující soupis prací, dodávek a služeb

Položkové rozpočty budou zpracovány dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., v kalkulačním programu KROS 4, s využitím, v době zpracování rozpočtu platné, Cenové soustavy ÚRS.

3.5.4 Projektová dokumentace bude po jejím zpracování zhotovitelem objednateli předána v písemné i grafické podobě, a to v počtu vyhotovení dle Přílohy č.1 a č.2 v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zhotovena ve formátu *.dwg (ver.min.2007), textové části budou zpracovány v programu MS Word ve formátu *.doc, nebo *.docx a tabulkové části budou zpracovány v programu MS Excel ve formátu *.xls, nebo *.xlsx. Veškeré výkresy i texty budou dále převedeny do *.pdf, včetně všech příloh (vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců sítí, apod.). Označení (číslování a popis) jednotlivých souborů bude korespondovat se seznamem příloh.

3.6 Předmětem **inženýrských činností**, které budou prováděny v rámci projektových činností jsou (zejména nikoliv však pouze):

a) zajištění všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy

3.7 Objednatel předal zhotoviteli pro provádění díla tyto podklady:

a) Základní informace pro zadání stavby, z 02/2021

a zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady seznámil a zároveň prověřil, že podklady nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je možno provést za cenu a v čase sjednaném v této smlouvě.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla dle této smlouvy.

4.2 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně upozornit objednatele na jakékoliv změny při provádění díla, které budou v rozporu s podklady dle čl. 3. odst. 3.7. této smlouvy, včetně vysvětlení všech konkrétních dopadů na ostatní části díla. Tyto změny s objednatelem následně projedná a o výsledku projednání vyhotoví zápis, který podepíší obě smluvní strany.

4.3 Zhotovitel se zavazuje po podpisu této smlouvy předložit platnou uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za způsobenou újmu v souvislosti s prováděním a provedením díla dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním v minimální výši 5 000 000 tak, aby toto pojištění trvalo po celou dobu účinnosti této smlouvy, tj. do doby uplynutí záruční doby dle čl. 7. odst. 7.2. této smlouvy. Náklady pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy. Originál nebo ověřenou kopii dokladu pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli do 10 dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

4.4. Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s prováděním a provedením díla dle této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu.

4.5 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, určeným objednatelem (bude-li ustanoven dle příslušného Zákona), jak ve fázi při přípravě stavby, tak i ve fázi realizace stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP všechny potřebné podklady nutné pro jeho činnost a dále je povinen zapracovat všechna opatření navržená koordinátorem BOZP do projektové dokumentace.

4.6 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem plánu BOZP, určeným objednatelem (bude-li ustanoven dle příslušného Zákona), jak ve fázi při přípravě stavby, tak i při případné aktualizaci plánu BOZP ve fázi realizace stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout zpracovateli plánu BOZP všechny potřebné podklady nutné pro jeho činnost a dále je povinen zapracovat všechna opatření navržená zpracovatelem plánu BOZP do projektové dokumentace.

4.7 Zhotovitel je povinen svolat nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy vstupní výrobní výbor za účasti zástupců objednatele, za účelem technické konzultace o předmětu smlouvy při zahájení projektových prací. V případě potřeby nebo na výzvu objednatele je zhotovitel povinen svolat výrobní výbory i ve stadiu rozpracovanosti díla dle této smlouvy.

Zápis ze vstupního výrobního výboru a ze všech dalších výrobních výborů ve stadiu rozpracovanosti díla zpracovává volnou formou zhotovitel.

- 4.8 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k připomínkování Projektové práce (PČ) (tak, jak jsou definovány Přílohou č. 1 této smlouvy) v rozsahu dle Vyhl. 499/2006 Sb., včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v termínech dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy – Maximální doba plnění.
- 4.9 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může v průběhu realizace stavby, pro kterou se projektová dokumentace dle této smlouvy zhotovuje, požadovat po zhotoviteli další projekční práce, jejichž nutnost provedení vznikne z objektivních a nepředpokládaných důvodů při realizaci stavby, a zavazuje se tyto pro objednatele provést.
- 4.10 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o potřebě provedení doplňujících činností, které nejsou specifikovány v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy a které jsou potřebné pro řádné provedení díla. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost dle předchozí věty a v průběhu následné realizace stavby vznikne objednateli v důsledku tohoto porušení povinnosti zhotovitele škoda v důsledku neúplných, nesprávných nebo neprovedených doplňujících činností (např., nikoliv však pouze, inženýrsko-geologický průzkum, stavebně technický průzkum, geodetické zaměření apod.), pak za tuto škodu zodpovídá zhotovitel.

5. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti z této smlouvy, může požadovat, aby zhotovitel zjednal okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel stanovené a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.2 Objednatel se zavazuje za provedení díla dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré, objednateli dostupné, podklady a informace potřebné pro řádné provedení díla dle této smlouvy.
- 5.4 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provádění díla.

6. DOBA PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 6.1 Práce na provedení díla budou zhotovitelem zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo po částech, když částí se rozumí vždy projektové práce a inženýrská činnost v rámci jedné fáze realizace stavby dle Přílohy č. 1 této smlouvy nebo každý dílčí další výkon dle Přílohy č. 2 této smlouvy. Dílo je provedeno řádným provedením jeho poslední části.
- 6.3 Dílo nebo jeho části jsou řádně provedeny jeho/jejich dokončením a předáním objednateli bez vad. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho části převzít pouze v případě, že budou bez vad.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje dílo, resp. jeho části, řádně provést v termínech, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy ve sloupci „MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ“. Řádně provedené dílo, resp. jeho části, předá zhotovitel objednateli v těchto stanovených termínech v sídle objednatele objednatelem pověřené osobě, o čemž bude pořízen předávací protokol

podepsaný oběma smluvními stranami. Nebude-li dílo nebo jeho části provedeny řádně, tj. bez vad, objednatel dílo nepřevzme a své výhrady a důvody nepřevzetí uvede v příslušném předávacím protokolu.

Důvody nepřevzetí díla nebo jeho částí:

- 6.4.1 Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování (dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy):
- projektové práce předložené k připomínkování nejsou vypracovány dle předmětu smlouvy a nejsou vypracovány v souladu s čl. 4.8 této smlouvy.
- 6.4.2 Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze (dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy):
- finální verze projektových prací není vypracována dle předmětu smlouvy nebo nemá zapracovány všechny relevantní připomínky objednatele, které objednatel zhotoviteli předal po kontrole projektových prací předložených k připomínkování.
- 6.4.3 Inženýrská činnost (IČ) (dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy):
- příslušná inženýrská činnost není vypracována dle předmětu smlouvy.
- 6.4.4 Další výkony (dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy):
- příslušný další výkon není vypracován dle předmětu smlouvy.
- 6.5 Převzetím řádně provedeného díla, resp. jeho částí, objednatelem, nabývá objednatel vlastnické právo k dílu, resp. jeho částí.
- 6.6 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, nebo jeho částí či částí, dle tohoto článku této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
- 6.7 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u objednatele. Termíny řádného provedení díla, nebo jeho částí či částí, dle tohoto článku této smlouvy se prodlužují o dobu, kterou vyvolalo zdržení na straně objednatele.
- 6.8 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla, resp. jeho částí či částí. Bude-li mít postup objednatele dle předchozí věty vliv na termíny řádného provedení díla, nebo jeho částí či částí, dle tohoto článku této smlouvy, termíny řádného provedení díla, resp. jeho částí či částí, se přiměřeně prodlouží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo, resp. na jeho jednotlivé části, záruku za jakost se záruční dobou v délce dle Přílohy č. 1 a v Přílohy č. 2 této smlouvy ve sloupci „ZÁRUČNÍ DOBA“.
- 7.3 Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vad vytknutých objednatelem v záruční době do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadě. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací.

- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
- 7.6 Oznámení o odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel objednateli záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 7.2. tohoto článku této smlouvy.

8. CENA

- 8.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH	2 399 370 ,- Kč
Sazba DPH	21%
DPH	503 868 ,- Kč

Cena včetně DPH 2 903 238 ,- Kč

Dále také jen „cena“.

- 8.2 Cena dle odst. 8.1. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná. Změna ceny je možná pouze:

- a) **v případě změny sazby DPH**, a to o částku odpovídající snížení nebo zvýšení sazby DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy
- b) **v případě změny rozsahu díla** dle požadavku objednatele, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku („vícepráce“ i „méněpráce“) dojde pouze v případech a za podmínek uvedených v této smlouvě :

- uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě opatřovacích podmínek,
- provedení změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku,
- služby nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě Dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů (slučitelnost/interoperabilita se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými v původním Zvolte položku. řízení) a způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, a hodnota dodatečného plnění nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; limit cenového nárůstu společně s nepředvídatelnými změnami nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku,
- potřeba změna vznikla v důsledku nepředvídatelné situace, kterou Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; změna nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky; hodnota změna nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; limit cenového nárůstu společně s dodatečnými plněními nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Ocenění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bude provedeno dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy a skutečného množství potřebných činností (doba strávená na cestě, doba strávená na stavbě, doba potřebná pro projekční práce, cestovné).

- 8.3 Cena je součtem cen za jednotlivé části díla, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 této smlouvy ve sloupci „CENA FÁZE“ a v Příloze č. 2 této smlouvy ve sloupci „CENA“.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu části ceny za každou řádně provedenou část díla, a to ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy ve sloupci „CENA FÁZE“ a v Příloze č. 2 této smlouvy ve sloupci „CENA“.

S výjimkou fáze č.9 – Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby - Výkon občasného autorského dozoru (AD), kde je zhotovitel oprávněn požadovat měsíční úhradu skutečných nákladů na cestovné, výkon projektanta/ů na cestě a výkon projektanta/ů, a to sumárně do celkových výší stanovených za jednotlivé činnosti v Příloze č. 1 ve sloupci „CENA FÁZE“.

- 9.2 Podkladem pro úhradu ceny díla nebo části ceny dle odst. 9.1. této smlouvy je daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 5 dnů po řádném provedení díla a jeho protokolárním převzetí objednatelem dle čl. 6. odst. 6.4. této smlouvy.

- 9.3 Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 9.4 Splatnost daňového dokladu – faktury se sjednává v délce 21 dnů od jejího doručení objednateli. Za den doručení se považuje den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.

- 9.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli daňový doklad – fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo která obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet po vystavení a doručení objednateli nového daňového dokladu – faktury zhotovitelem.

- 9.6 Zálohy na cenu se neposkytují. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2611 občanského zákoníku. S výjimkou fáze č.9 - Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby - Výkon občasného autorského dozoru (AD).

- 9.7 Cena nebo části ceny budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře.

10. SANKCE

- 10.1 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

- 10.2 Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, resp. jeho části, dle čl. 6. odst. 6.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla uvedené ve sloupci „CENA FÁZE“ v Příloze č. 1 této smlouvy či „CENA“ v Příloze č. 2 této smlouvy za každý jednotlivý den prodlení po termínu předání řádně provedeného díla, resp. jeho části, a to až do doby takového předání.
- 10.3 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý den prodlení a každý jednotlivý případ reklamované vady.
- 10.4 V případě porušení závazků či povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
- 10.5 V případě porušení požadavků na dodržení „Zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací“ Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý případ porušení zásad sjednaných v čl.3., bodu 3.2
- 10.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu újmy vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím zhotovitele, které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou. Smluvní strany se pro takový případ dohodly na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku.
- 10.7 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná osoba obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za doručenu okamžikem, kdy se dostane do dispozice povinné strany. V případě písemné výzvy zasílané poštou se má za to, že se výzva dostala do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s výzvou byla uložena k vyzvednutí.

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1 Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak.
- 11.3 Pro případ, že by dílo nebo jeho část naplnilo znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu § 2358 občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoliv část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.

V Českých Budějovicích, dne 18.6.2021


V Českých Budějovicích, dne 28-06-2021

Zhotovitel :

Objednatel :



I&C Energo a.s.
Ing. Jiří Holinka, MBA
předseda představenstva



I&C Energo a.s.
Ing. Štefan Okruhlica
místopředseda představenstva



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice


Projednáno a schváleno představenstvem JVS
dne 15.6.21
č. usnesení 29716
ověřeno 

ZÁKLADNÍ DOTAZNÍK INVESTIČNÍ AKCE/OPRAVY

Číslo akce	1063
Název akce	Rekonstrukce rozvaděčů a kabelového kolektoru ČS Plav

Skupina	Úpravná vody
Místo akce	Plav

Územní inspektor	Jaroslav Gazda
Vedoucí provozní oblasti	Ladislav Chyňava - vedoucí provozu úpravní

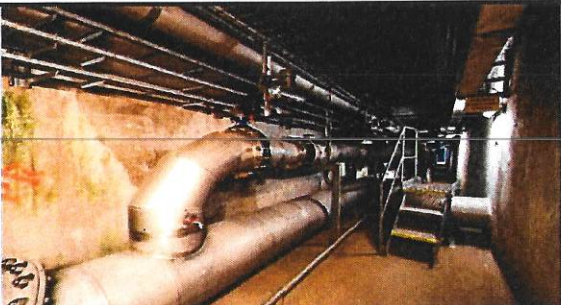Mapa, fotografie akce	
-----------------------	--

Zdůvodnění, popis akce	Zdůvodnění: Stávající kabelové trasy v kolektoru čerpací stanice a v kabelovém kolektoru úpravní vody Plav jsou ve špatném technickém stavu a je nutné přistoupit k jejich výměně tak, aby byl zachován stabilní provoz úpravní vody. Dále musí být provedena rekonstrukce el. rozvodů v budově filtrace a budově dávkování. Popis akce: Stávající kabelové trasy v kolektoru ČS a kabelovém kolektoru budou postupně demontovány a budou nahrazeny novými kabelovými rozvody. Stávající el. rozvaděče NN v rozvodně budovy filtrace a budovy dávkování budou v rámci akce rekonstruovány. Stávající kabelové žláby budou nahrazeny novou konstrukcí. Rekonstrukce el. rozvaděčů a výměna kabelových rozvodů bude prováděna za provozu, v projektové dokumentaci bude navržena vhodná etapizace tak, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý provoz čerpací stanice při následné realizaci stavby. Součástí stavby bude provedení nejnutnějších stavebních úprav a sanací poruch povrchů.
------------------------	---

Propočet nákladů akce (mil.Kč bez DPH)	23,000
Předpokládaný termín výstavby (rok)	2022
Předpokládaná doba výstavby (měsíce)	10

Výkony dle řádku

1 399 370 Kč
CENA CELKEM
1 949 764 Kč

výpis/uchazeč u "ANO"

0 a)	STU	Stupeň a obsah odborného dozoru		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		0.1.1 a) Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	- Zpracování studií demontážních, architektonických a environmentálních - Zpracování studií obnoveného a stávajícího řešení jednotlivých objektů - Zpracování studií vnitřního vzhledu objektů - Zpracování studií technických a technických - Zpracování studií technických a technických	NE		0 Kč	0	0 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy 0 kalendářních dnů, ode dne předání připomínek	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		0.1.2 a) Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Studie		NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze Studie	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		0.1.3 a) Inženýrská činnost (IČ)		NE				viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 0.1.1 a)	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
1	VSP	Zpracování vstupních podkladů		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		1.1	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	ANO	247 283 Kč	247 283 Kč	NEUPLATÍ SE	0 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		1.2	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Studie	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze Studie	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		1.3	Inženýrská činnost (IČ)	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze Studie	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
0 b)	EIA	Environmentální Impact Assessment		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		0.1.1	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	NE		0 Kč	0	0 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		0.1.2	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Studie	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze Studie	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		0.1.3	Inženýrská činnost (IČ)	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze Studie	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
2	DUR IČ UR	Fázová studie - zpracování projektové přílohy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UR)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		2.1	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	NE		0 Kč	0	0 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		2.2	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DUR	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DUR	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DUR
		2.3	Inženýrská činnost (IČ)	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DUR	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DUR
3	DPS IČ SP	Fázová studie - zpracování projektové přílohy pro stavební povolení (DPS) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		3.1	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	NE		0 Kč	0	0 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		3.2	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DPS	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DPS
		3.3	Inženýrská činnost (IČ)	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DPS	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DPS
		3.4	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	NE		0 Kč	0	0 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		3.5	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DPS	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DPS
		3.6	Inženýrská činnost (IČ)	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DPS	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DPS
4 a)	DPS IČ PS	Fázová studie - zpracování projektové přílohy pro stavební povolení (DPS) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ PS)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		4.1 a)	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	NE		0 Kč	0	0 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		4.1 b)	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DPS	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DPS
		4.1 c)	Inženýrská činnost (IČ)	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DPS	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DPS
4 b)	DPS IČ PS	Fázová studie - zpracování projektové přílohy pro stavební povolení (DPS) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ PS)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		4.2 a)	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	ANO	1 528 647 Kč	1 551 127 Kč	8	180 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	80 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		4.2 b)	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS	ANO	22 480 Kč			0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DPS	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DPS
		4.2 c)	Inženýrská činnost (IČ)	ANO				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DPS	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DPS
5	DSJ IČ DSJ	Fázová studie - zpracování projektové přílohy pro stavební povolení (DSJ) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ DSJ)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		5.1	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	NE		0 Kč	0	0 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		5.2	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSJ	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DSJ	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DSJ
		5.3	Inženýrská činnost (IČ)	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DSJ	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DSJ
6	DPS IČ PS	Fázová studie - zpracování projektové přílohy pro stavební povolení (DPS) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ PS)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		6.1	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	NE	0 Kč	0 Kč	NEUPLATÍ SE	NEUPLATÍ SE	NEUPLATÍ SE
		6.2	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS	NE	0 Kč			NEUPLATÍ SE	NEUPLATÍ SE
		6.3	Inženýrská činnost (IČ)	NE				NEUPLATÍ SE	NEUPLATÍ SE
9	AD	Fázová studie - zpracování projektové přílohy pro stavební povolení (AD) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ AD)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		9.1	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	ANO	8 000 Kč	151 360 Kč	0	0 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		9.2	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze AD	ANO	31 360 Kč			0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze AD	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze AD
		9.3	Inženýrská činnost (IČ)	ANO	112 000 Kč			0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze AD	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze AD
11	DPS IČ PS	Fázová studie - zpracování projektové přílohy pro stavební povolení (DPS) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ PS)		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		11.1	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	NE	0 Kč	0 Kč	NEUPLATÍ SE	NEUPLATÍ SE	NEUPLATÍ SE
		11.2	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DPS	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DPS
		11.3	Inženýrská činnost (IČ)	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze DPS	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze DPS
12	Dokumentace bázeřských prací	Dokumentace bázeřských prací		ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		12.1	Projektová práce (PČ) - předložit k připomínkám	NE		0 Kč	0	0 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie
		12.2	Projektová práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace bázeřských prací	NE				0 kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze Dokumentace bázeřských prací	0 měsíců, od data předání a převzetí finální verze Dokumentace bázeřských prací

Další výkony

CENA CELKEM
449 602 Kč

vyplňuje uchazeč u "ANO"

Porč.č.	popis	ANO NE	CENA	POČET VYHOTOVENÍ/ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
1.1	průzkumné práce - geologické	NE		0	0	0
1.2	průzkumné práce - geodetické	NE		0	0	0
1.3	průzkumné práce - hydrologické	NE		0	0	0
1.4	průzkumné práce - seismické	NE		0	0	0
1.5	průzkumné práce - balneologické	NE		0	0	0
1.6	průzkumné práce - jiné	ANO	112 401 Kč	8	viz max doba plnění 4.1.1.b) Výkony dle fází	viz záruční doba 4.1.2.b) Výkony
2.	geodetická dokumentace	NE		0	0	0
3.	zabezpečení zdrojů financování	NE		0	0	0
4.	správní a jiné poplatky	NE		0	0	0
5.1	zabezp.majetkoprávní agendy - vstup na pozemky	NE		0	0	0
5.2	zabezp.majetkoprávní agendy - výkup anebo vydláždění a nájem pozemků popř. objektů	NE		0	0	0
5.3	zabezp.majetkoprávní agendy - správní poplatky	NE		0	0	0
5.4	zabezp.majetkoprávní agendy - věcná břemena	NE		0	0	0
5.5	zabezp.majetkoprávní agendy - projednání s majiteli pozemků	NE		0	0	0
5.6	zabezp.majetkoprávní agendy - zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou	NE		0	0	0
5.7	zabezp.majetkoprávní agendy - jiné	NE		0	0	0
6.	účast na zkušebním provozu	ANO	22 480 Kč	0	0	0
7.	vypřacování energetického průřezu budovy podle zákona o hospodaření energií	NE		0	0	0
8.	uzavírky komunikací, dopravní řešení (DIO)	NE		0	0	0
9.	projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní provoz atd.	ANO	89 920 Kč	8	viz max doba plnění 4.1.1.b) Výkony dle fází	viz záruční doba 4.1.2.b) Výkony
10.	výjádření správních orgánů o potřebě/nepotřebě správních aktů (Úř, SP, OHL)	NE		0	0	0
11.	provozní řád (nový/aktualizace)	NE		0	0	0
12.	průzkum stávajících kabelů - jejich identifikace a označení, provedení navigačního zápisu	ANO	224 801 Kč	8	viz max doba plnění 4.1.1.b) Výkony dle fází	viz záruční doba 4.1.2.b) Výkony
13.	0	NE		0	0	0
14.	0	NE		0	0	0
15.	0	NE		0	0	0
16.	0	NE		0	0	0
17.	0	NE		0	0	0
18.	0	NE		0	0	0
19.	0	NE		0	0	0
20.	0	NE		0	0	0

Výkon občasného autorského dozoru (AD) na stavbě	1063
Rekonstrukce rozvaděčů a kabelového kolektoru ČS Plav	

Místo, sídlo	Adresa
Sídlo projektanta	
Místo stavby	ÚV Plav

Geografické údaje			
Vzdálenost mezi sídlem projektanta a místem stavby (km)		10	
Čas potřebný pro překonání vzdálenosti mezi sídlem projektanta a místem stavby		17	0,28

Jednotkové ceny	Kč
Tarif - Cestovné (Kč/km)	10,00 Kč
Tarif - výkon projektanta/tů na cestě (Kč/hod)	700,00 Kč
Tarif - výkon projektanta/tů (Kč/hod)	700,00 Kč

Náklady na cestovné	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na cestovné za 1 cestu	km	20	10,00 Kč	200 Kč
Předpokl.počet návštěv stavby projektantem/ty po dobu výstavby		40		
Náklady na cestovné za předpokl.počet návštěv stavby projektantem/ty po dobu výstavby	km	800	10,00 Kč	8 000 Kč


Náklady na výkon projektanta/tů na cestě	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na výkon 1 projektanta na cestě	hod	0,56	700,00 Kč	392 Kč
Předpokl.počet návštěv stavby projektantem/ty po dobu výstavby		40		
Předpokl.počet projektantů na jedné cestě		2		
Náklady na výkon projektanta/tů na cestě po dobu výstavby	hod	44,8	700,00 Kč	31 360 Kč

Náklady na výkon projektanta/tů	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na výkon 1 projektanta za 1 návštěvu stavby při předpokládaném množství	hod	2	700,00 Kč	1 400 Kč
Předpokl.počet návštěv stavby projektantem/ty po dobu výstavby		40		
Předpokl.počet projektantů na jedné návštěvě stavby		2		
Náklady na výkon projektanta/tů po dobu výstavby	hod	160	700,00 Kč	112 000 Kč

Předpokládané náklady na AD po dobu výstavby	8 000 Kč
Náklady na cestovné	31 360 Kč
Náklady na výkon projektanta/tů na cestě	112 000 Kč
Celkem	151 360 Kč

vyplňuje uchazeč

Mapa - vzdálenost mezi sídlem projektanta a místem stavby



VZOR - Mapa - vzdálenost mezi sídlem projektanta a místem stavby (zdroj : Seznam - Mapy)

