

Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem****„Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí, rekonstrukce silnice“****Číslo smlouvy objednatele:****Číslo smlouvy zhotovitele: 17-021AD-4**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

dále jen „objednatel“

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem: Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČ: 24668613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 4. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
 4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:
 - a. Název: Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí, rekonstrukce silnice
 - b. Místo provádění: Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí(dále jen „stavba“).
- Bližší popis stavby, včetně její dokumentace, je obsažen v Příloze č. 1 této smlouvy – „Specifikace akce“.
5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že pro spolufinancování realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být využit některý dotační program. Zhotovitel se v případě spolufinancování realizace stavby a/nebo plnění dle této smlouvy z dotačního programu zavazuje dodržovat veškerá pravidla stanovená v souvislosti se spolufinancováním z tohoto programu.

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované plnění.

Článek II. Specifikace plnění

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout plnění v tomto rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek:

- **provedení přípravných předprojektových prací** (průzkumy a zaměření), a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 1 (dále jen „předprojektové práce“);
- **zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 3, a to (dále jen „projektová dokumentace“);
- **inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení** (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy – „Podrobná specifikace provedení díla“ odst. 4;
- **poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby dle projektové dokumentace** v tomto rozsahu:
 - aktualizace oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby,
 - zpracování podkladů pro vysvětlení zadávací dokumentace, popř. námitky, v rámci zadávacího řízení či zadávacích řízení na dodavatele stavby, pokud se tyto dodatečné informace, popř. námitky vztahují k projektové dokumentaci, a
 - zapracování změn do projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb v souvislosti s vysvětlením či změnami zadávací dokumentace,
 - účast v hodnotící komisi v zadávacím řízení na dodavatele stavby dle projektové dokumentace, pokud bude hodnotící komise ustanovena, a to v rozsahu 1 člena hodnotící komise a 1 náhradníka za člena hodnotící komise (zhotovitel je povinen zajistit, že jím navržený člen hodnotící komise a náhradník za člena hodnotící komise budou mít ukončené vysokoškolské vzdělání stavebně technického zaměření)

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“),

- **provedení autorského dozoru** (dále jen „autorský dozor“) za předpokladu, že bude stavba realizována, a to v rozsahu požadavků objednatele a v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 5.

(společně dále jako „dílo“)

2. V rámci provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržet zejména tyto podmínky:

- dílo musí být provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj **č. 499/2006 Sb.**, o dokumentaci staveb, v platném znění,
- dílo musí být provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj **č. 169/2016 Sb.**, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- dílo musí být předáno objednateli v rozsahu a v podobě specifikovaných v Příloze č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci zadávacího řízení a musí tak být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito.

Článek III. **Kontrola provádění plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným způsobem.

Článek IV. **Čas a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:
- zahájení předprojektových prací: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**
 - předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou: **nejpozději do 75 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**
 - předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 195 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**
objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu projektové dokumentace a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu **nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu,**
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 225 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 345 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**
 - poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): **po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,**
 - provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): **po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla,** a to i v případě, že skutečná doba

provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

2. Zhotovitel je oprávněn předat jednotlivé části plnění v termínech dle čl. IV odst. 1 výše kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí příslušné části plnění s výjimkou, že čas příslušné části plnění připadne na poslední den lhůty.
3. Místem plnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s každou částí plnění dle této smlouvy všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli a objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo bezvadně dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. Dílo bude předáváno nejpozději dle harmonogramu a specifikace uvedené v bodě IV.1 výše.
2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání díla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při jeho předání.

Vzor předávacího protokolu je součástí Přílohy č. 3 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případně zjištěné zjevné vady předaného díla. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud však objednatel zjistí, že předané dílo trpí zjevnými

vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. odst. 2 této smlouvy.
6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy.
8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatel

a způsobem dle požadavku objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace bude autorizována osobami, které doložil ve své nabídce na plnění Veřejné zakázky pro účely hodnocení nabídek, s tím, že pokud zhotovitel doložil obě požadované autorizace jednou osobou, musí být projektována dokumentace autorizována touto osobou jako celek, a pokud zhotovitel doložil každou požadovanou autorizaci jinou osobou, musí jedna z těchto osob autorizovat projektovou dokumentaci jako celek a druhá z těchto osob autorizovat alespoň ty objekty, ke kterým se daný typ autorizace vztahuje. Změna autorizované osoby je možná pouze za podmínky, že nová osoba splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako původní osoba a zároveň by se v rámci hodnocení umístila minimálně na stejném místě jako původní osoba. Zhotovitel je vždy povinen neprodleně, nejpozději však do sedmi (7) dnů, písemně oznámit objednateli změnu autorizované osoby včetně informací a dokladů dokládajících splnění podmínek dle tohoto článku smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů s předchozím souhlasem objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám. Aktuální seznam poddodavatelů je uveden v Příloze č. 5 této smlouvy – „Seznam poddodavatelů“. Jakoukoli změnu v osobách poddodavatelů je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.
10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.
11. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v Příloze č. 4 této smlouvy, a to včetně

jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.

2. Cena za součinnost při zadávacím řízení není samostatně naceňována a cena za součinnost při zadávacím řízení je již zohledněna v celkové ceně díla.

3. Objednatel neposkytuje zálohy.

4. Ceny sjednané v Příloze č. 4 této smlouvy jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Je-li v Příloze č. 4 této smlouvy uvedena časová cena (tj. cena vyjádřená časovou sazbou, tedy cena za hodinu, např. u autorského dozoru) je taková časová cena konečná a nepřekročitelná s tím, že skutečná cena bude vypočtena jako násobek časové ceny a počtu skutečně čerpaných/poskytnutých časových jednotek. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:

- 70 % z celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci po předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace, a to za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je finální verze jednostupňové projektové dokumentace akceptována objednatelem bez výhrad,
- zbylou část celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci (tj. zbylých 30 %) a cenu za inženýrskou činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení (povolení stavby) po předání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby,
- cena za součinnost při zadávacím řízení je již zahrnuta v celkové ceně za dílo a nebude samostatně hrazena,
- cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského dozoru zhotoviteli. Cena bude účtována podle skutečně odvedené činnosti dle časové (hodinové) sazby za výkon autorského dozoru uvedené v příloze č. 4 této smlouvy, vždy na základě vzájemného odsouhlasení počtu hodin objednatelem a zapsáním výsledku do stavebního deníku. V případě, že nebude počet hodin poskytování služeb autorského dozoru odsouhlasen či zapsán ve stavebním deníku, nemá zhotovitel nárok fakturovat tuto činnost.

6. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena ve 2 originálech a je splatná v době 30 dnů od vystavení a musí být doručena na adresu Krajská správa silnic Libereckého kraje, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou.

Fakturační adresa je:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČ: 70946078

DIČ:

CZ70946078

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- den uskutečnění plnění,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn sdělit zhotoviteli další případné požadavky na obsah a formu faktury (např. požadavky plynoucí ze způsobu financování plnění dle této smlouvy).
8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby ve sjednané lhůtě ani v případně dohodnuté dodatečně prodloužené lhůtě, pak zhotoviteli místo odměny uhradí objednatel pouze náklady (zahrnuté zhotovitelem v ceně za obstarání pravomocného stavebního povolení či ohlášení stavby dle Přílohy č. 4 této smlouvy), které zhotovitel v souvislosti s tímto plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit. Pokud nastane případ dle tohoto bodu této smlouvy, nevzniká zhotoviteli současně ani nárok na úhradu zbylé části celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci (tj. zbylých 30 % - viz bod VII.5 této smlouvy).
11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby ve sjednané lhůtě v důsledku porušení povinností zhotovitele, pak zhotoviteli nenáleží odměna za obstarání pravomocného stavebního povolení či ohlášení stavby ani úhrada jakýchkoli nákladů, které zhotovitel v souvislosti s obstaráváním stavebního povolení či ohlášení stavby vynaložil. Pokud nastane případ dle tohoto bodu této smlouvy, nevzniká zhotoviteli současně ani nárok na úhradu zbylé části celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a ceny za jednostupňovou

projektovou dokumentaci a ceny za obstarání pravomocného stavebního povolení (či souhlasu) (tj. zbylých 30 % - viz bod VII.5 této smlouvy).

Článek VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zhotovitele, které vzniknou realizací předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla.
3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do ukončení realizace stavby, nejpozději však do 5-ti let od řádného převzetí projektové dokumentace.
4. Objednatel je povinen takto zjištěnou skrytou vadu díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti pracovních dnů od okamžiku jejího zjištění. V případě, že bude tato skrytá vada díla zjištěna zhotovitelem stavebních prací v rámci provádění stavby, má se za okamžik zjištění vady díla objednatelem okamžik, kdy je mu taková vada prokazatelně oznámena zhotovitelem stavebních prací.
5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
6. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 20 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

Článek IX.

Vlastnické právo a právo užití

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem podání žádosti o dotaci a realizace stavby včetně výběru dodavatele stavby.
3. V případě, že budou kterékoli části díla podléhat ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).
4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na

poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.
7. V případě, že se ukáže v budoucnu potřeba upravit možnosti užívání díla samostatnou licenční smlouvou nebo případně jinou formou, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou k uzavření takové smlouvy.
8. Strany si výslovně sjednávají, že v případě potřeby uzavření jakékoli další licenční nebo obdobné smlouvy, bude tato sjednána pro objednatele bezplatně, neboť veškeré případné ceny licencí jsou zahrnuty již v ceně díla.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny stanovené v čl. IV této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené v čl. VIII této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
3. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ prodloužení.
4. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení.
5. V případě neúplného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
6. V případě chybějící položky soupisu prací, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
7. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.
8. Objednatel je oprávněn započíst částku smluvní pokuty proti případným pohledávkám

zhotovitele.

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně porušení povinnosti a stanoví lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud ke sjednání nápravy v této lhůtě nedojde, bude od smlouvy odstoupeno.

Článek XII.

Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
 - Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení KSSLK, tel.: 724 844 522, e-mail: martin.cap@ksslk.cz;
 - Ing. Adéla Macháčková, specialista na přípravu projektů KSSLK, tel: 778 703 083, e-mail: adela.machackova@ksslk.cz.
2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
 - Ing. Robert Weisz, jednatel společnosti, tel.: 702 155 581, e-mail: robert.weisz@advisia.cz
 - Ing. Miroslav Větrovský, technický specialista, tel.: 730 190 190, e-mail: miroslav.vetrovsky@advisia.cz
3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
7. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami a

účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 Specifikace akce

Příloha č. 2 Podrobná specifikace provedení díla

Příloha č. 3 Vzor předávacího protokolu

Příloha č. 4 Podrobný rozpis ceny

Příloha č. 5 Seznam subdodavatelů

V Jablonci nad Nisou dne 6. 11. 2017

V Praze dne 17. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (511)


.....
za Advisia s.r.o.
Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti

ADVISIA

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613

Prověřil a doporučuje k podpisu:

Podpis

Datum

L



7. 11. 2017

PŘÍLOHA č. 1
SPECIFIKACE AKCE

Název akce:		Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí, rekonstrukce silnice			
Datum:	4.4.2017	Staničení:	5,406 - 13,556	Mostů:	5
Silnice:	III/26834	Délka úseku:	8 150 m	Zdí :	cca 3
Okres:	Česká Lípa	Šířka úseku:	6,0 m	Propustů:	20

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 12/2009. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Popis současného stavu:

Řešeným úsekem je úsek silnice III/26834 od křižovatky s III/2708 v obci Brniště, místní část Velký Grunov po křižovatku s II/270 v obci Jablonné v Podještědí, tedy od km 5,406 - 13,556 provozního staničení. Předmětný úsek délky 8,15 km je s průměrnou šířkou vozovky 6,0m veden v extravilánu a intravilánu obce Brniště, místní část Velký Grunov, obce Brniště, obce Velký Valtinov a města Jablonné v Podještědí. Vozovka vykazuje závady: korozí obusné vrstvy, trhliny, lokální výtluky, plošná deformace vozovky, prolomení vozovky, zvýšená nebezpečná krajnice, zanesené příkopy. Povrch byl v dřívějších letech opravován lokálními opravami vozovkových vrstev. Na úseku jsou chybějící svodidla, nebo zastaralá. Osazeny jsou v nenormových krajnicích nedostatečně šířky. Okraj silnice v některých úsecích lemují stromy. V řešeném úseku se nachází příčné propustky, které jsou součástí komunikace. V průtahu obcí Brniště se nachází podél komunikace chodník. Odvodnění komunikace je z velké části nefunkční. Vodorovné dopravní značení není. V úseku jsou opěrné a nábřežní zdi, které jsou součástí komunikace. Součástí úseku je i most ev.č. 26834-5, stavební stav spodní stavby je klasifikován stupněm V-špatný, stavební stav nosné konstrukce je klasifikován stupněm IV-uspokojivý; ev.č.26834-6, stavební stav spodní stavby je klasifikován stupněm III-dobry, stavební stav nosné konstrukce je klasifikován stupněm III-dobry; ev.č. 26834-7, stavební stav spodní stavby je klasifikován stupněm VI-velmi špatný, stavební stav nosné konstrukce je klasifikován stupněm VI-velmi špatný; ev.č. 26834-8, stavební stav spodní stavby je klasifikován stupněm V-špatný, stavební stav nosné konstrukce je klasifikován stupněm V-špatný; ev.č. 26834-9, stavební stav spodní stavby je klasifikován stupněm VI-velmi špatný, stavební stav nosné konstrukce je klasifikován stupněm V-špatný.

Stručný popis požadovaných úprav komunikace:

Provede se geodetické zaměření a zjištění inženýrských sítí a diagnostika vozovky z které vyjde způsob rekonstrukce řešeného úseku silnice III/26834, bude prověřena možnost sjednocení na jednotnou kategorií šířku. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nebezpečných krajnic - v případě, že budou krajnice nenormové, budou uvedeny do normových šířek. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Zároveň budou navrženy stromy, u kterých dojde k prořezání či odstranění stromů, jejichž větve zasahují nad průjezdný profil silnice. Součástí akce bude provedena kompletní obnova odvodnění včetně rekonstrukce všech propustů. Počet propustků je pouze orientační a v případě většího množství propustků se nezvyšuje cena díla. Budou modernizovány nebo zřízeny nové příkopy. Součástí akce je zrekonstruování autobusových zastávek - tzn. vybudování normových nástupišť. V případě, že zastávky jsou v autobusových zálevech, je součástí akce i rekonstrukce autobusových zálevů. V rámci rekonstrukce se provede obnova a doplnění vodorovného dopravního značení v plastu a kompletní výměna a doplnění svislého dopravního značení. Zároveň bude provedena modernizace zádržných systémů dle platných předpisů a jejich případné doplnění. V místech nedostatečně široké krajnice pro svodidla bude provedeno rozšíření pomocí armovaného násypu nebo opěrné zdi. Bude provedena rekonstrukce všech opěrných zdí. Počet zdí je pouze orientační v případě většího, počtu zdí se nezvyšuje cena díla. Situace navrženého dopravního značení celého úseku (VDZ a SDZ) včetně úpravy a doplnění zachytných systémů bude odsouhlasena Polici ČR. Veškeré práce musí být představeny investorovi akce a technické řešení musí být investorem odsouhlaseno. V projektu bude provedena koordinace s plánovanými požadavky obce a jiných investorů tak, aby v budoucnu nebylo zasahováno při výstavbě těchto záměrů do rekonstruované komunikace. V rámci této stavby bude řešen vyvolaný zásah do stávajících inženýrských sítí a zásah do pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje, tyto činnosti nezvyšují cenu projekčních prací. V ceně díla je zahrnuto zapracování zpracované projektové dokumentace na odvodnění cca 100 m komunikace v Jabloném v Podještědí.

Stručný popis požadovaných úprav mostních objektů:

U mostu 26834-5 a 26834-6 a 26834-7 a 26834-8 a 26834-9 zadavatel požaduje zpracovat diagnostický průzkum a dle závěrů průzkumu a hlavní mostní prohlídky provést návrh na rekonstrukci či modernizaci mostů.

Požadované průzkumy a měření:

Geodetické zaměření potřebné pro projekt včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí
 Diagnostika vozovek dle platných předpisů, zejména ČSN - 721191, 736133, 736160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 209 (včetně zjištění únosnosti podloží - silniční pláně)
 Diagnostický průzkum mostu ev.č. 26834-5 a ev.č. 26834-6 a ev.č. 26834-7 a ev.č. 26834-8 a ev.č. 26834-9
 Dendrologický průzkum
 Geologický průzkum, 1ks sondy pro každý most a zeď

Přílohy:

Příloha 1A	Situace stavby
Příloha 1B	Fotodokumentace
Příloha 1C-1	HPM 26834-5
Příloha 1C-2	Mostní list 26834-5
Příloha 1D-1	HPM 26834-6
Příloha 1D-2	Mostní list 26834-6
Příloha 1E-1	HPM 26834-7
Příloha 1E-2	Mostní list 26834-7
Příloha 1F-1	HPM 26834-8
Příloha 1F-2	Mostní list 26834-8
Příloha 1G-1	HPM 26834-9
Příloha 1G-2	Mostní list 26834-9

PŘEHLEDNÁ SITUACE

Příloha 1A



PŘÍLOHA 1B - FOTODOKUMENTACE



Silnice III/26834 Brniště – Velký Valtinov, rekonstrukce silnice

Most 26834 - 5

Most přes potok v Brništi

HLAVNÍ PROHLÍDKA

□

Objekt: Most ev. č. 26834 - 5 (Most přes potok v Brništi)

Okres: Česká Lípa

Prohlídku provedla firma: Nežadáno

Prohlídku provedl: Ehrenberger Jiří, Ing.

Datum provedení prohlídky: 1.9.2014

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Teplota vzduchu: 14 °C

Teplota NK: 12 °C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 26834

Staničení km: 7,481

Ev. č. mostu: 26834 - 5

Název objektu: Most přes potok v Brništi

Staničení ve směru: komunikace

Způsob zpřístupnění:

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 1.1 | Mostní podpěry
- Opěry | Založení mostu není přístupné. S ohledem na stáří objektu se předpokládá plošné založení opěr mostu na vrstvách náplavových sedimentů. |
|-----|---------------------------|--|

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 2.1 | Mostní podpěry
- Opěry | Opěry mostu jsou ve spodní části původní, z řádkového zdiva z kamenných kvádrů s vyspárováním cementovou maltou. V horní části jsou provedeny nové úložné monolitické železobetonové prahy včetně závěrných zídek. |
| 2.2 | Křídla | Most je proveden bez křídel, na opěry mostu přímo navazují nábrežní zdi přemostňované vodoteče. Nábrežní zdi jsou pravděpodobně z prostého nebo slabě vyztuženého betonu. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 3.1 | Nosná konstrukce | Nosnou konstrukci mostu tvoří 16ks prefabrikovaných železobetonových nosníků typ ŽMP62 délky 4,80m. Nosná konstrukce mostu je provedena jako přímo pojížděná. |
| 3.2 | Ložiska | Uložení nosné konstrukce mostu je přímé, bez ložisek. Nosníky jsou uloženy na vrstvu lepenky na horním povrchu úložných prahů opěr. |
| 3.3 | Mostní závěry | S ohledem na typ a rozpětí nosné konstrukce je most proveden bez mostních závěrů. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

- | | | |
|-----|-----------------|---|
| 4.1 | Vozovka | Na mostě je proveden vozovka s živičným krytem, předpokládána tloušťka konstrukce vozovky do 100mm. |
| 4.2 | Izolační systém | S ohledem na stáří konstrukce mostu se předpokládá |

- celoplošná izolace z natavovaných asfaltových izolačních pásů (NAIP). Izolace mostu je provedena bez odvodňovačů izolace.
- 4.3 Římsy Na obou okrajích mostu jsou provedeny monolitické železobetonové římsy.
5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení
- 5.1 Záchytná zařízení
- Zábradlí Na obou římsách mostu je provedeno atypické zábradlí s železobetonovými sloupky a horním madlem a s ocelovou vodorovnou výplní.
6. Cizí zařízení
- 6.1 Vedení, chráničky Na pravé straně mostu je přímo na římsě uložena ocelová chránička, zřejmě kabelové vedení.
7. Území pod mostem a přístupové cesty
- 7.1 Území pod mostem Koryto vodoteče pod mostem je zpevněno dlažbou z lomového kamene včetně vyspárování. Na vtoku a výtoku je dlažba ukončena příčnými prahy z prostého betonu.
- 7.2 Přístupové cesty Most a území pod mostem je těžko přístupné, na most navazují nábrežní zdi přemostované vodoteče.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

- 1.1 Základy mostních podpěr a křídel Opěry mostu nevykazují žádné závady signalizující poruchy založení mostu.
- Opěry

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- 2.1 Mostní podpěry
- Opěry Beton opěr je nízké kvality, povrch betonu je plošně degradován, na lících obou opěr jsou patrné stopy, mapy, po dlouhodobém prosakování vody dříky opěr. V úrovni hladiny vody vznikají, ve stěnách nad řadou kamenných kvádrů, kaverny. Mezi opěrami a nábrežními zdmi jsou otevřené pracovní spáry. Na úložné prahy opěr dlouhodobě zatéká, na úložných prazích jsou průsaky s výluhy.

3. Nosná konstrukce

- 3.1
- Nosná konstrukce Dlouhodobě zatéká do všech spár nosné konstrukce mezi nosníky, nejintenzivnější zatékání je u krajních nosníků. Nosníky mají nedostatečné krytí výztuže, na spodním lici je plošně prokreslena příčná výztuž nosníků. Lokálně je krycí vrstva betonu odpadlá a betonářská výztuž je obnažena, oslabení výztuže korozí je v těchto místech odhadem do 5% průřezové plochy.

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

- 5.1 Vozovka Ve vozovce jsou lokálně provedeny opravy výtlučků, podél říms je vrstva nečistot a je zde uchycena vegetace.
- 5.2 Římsy Povrch betonu říms je plošně degradován.

6. Izolační systém

- | | |
|-----|---|
| 6.1 | Plošná izolace mostu je na konci životnosti, respektive je z větší části nefunkční. |
|-----|---|

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 8.1 | Zábradlí | Beton zábradlí na mostě je plošně degradován. Vodorovná ocelová výplň je lokálně deformovaná a plošně koroduje. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu zábradlí nevyhovuje požadavkům platných předpisů. |
| 8.2 | Označení mostu | Chybí evidenční čísla mostu. |
| 8.3 | Dopravní značení | Chybí svislé dopravní značení s vyznačením zatížitelnosti mostu. |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

- | | | |
|------|------------------|---|
| 11.1 | Území pod mostem | Koryto vodoteče pod mostem je částečně zanesené, zejména na návodní straně mostu. |
|------|------------------|---|

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

- Osadit tabulky s evidenčním číslem mostu.

4.odstranění do nejbližšího zimního období

- Provést vyčištění koryta vodoteče pod mostem od naplavenin.

3.odstranění nutno do 1 roku

- Osadit svislé dopravní značení s vyznačením zatížitelnosti mostu.
- Provést ošetření obnažené korodující výztuže v podhledu nosné konstrukce a sanaci poškozených míst.

2.odstranění nutno do 5 let

- S ohledem na lokální poruchy izolace mostu a omezenou funkčnost odvodnění přechodových oblastí doporučujeme zahájit přípravu opravy mostního svršku, respektive opravy izolace a opravy odvodnění přechodových oblastí.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A

TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :26.9.2014

Poznámka :

O výsledku hlavní prohlídky mostu byl informován zodpovědný zástupce správce objektu - Krajské správy silnic Libereckého kraje - Tomáš Machalík, vedoucí mostmistr.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU**Stavební stav****Spodní stavba**

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:
V - Špatný $a = 0,6$

Nosná konstrukce

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:
IV - Uspokojivý $a = 0,8$

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

 $V_n = 14 \text{ t}$ $V_r = 28 \text{ t}$ $V_e = 39 \text{ t}$

Použitelnost: Nezadaná

Maximální nápravový tlak = 8,6 t

Zatížitelnost mostu byla převzata z předchozí HPM a redukována stupněm stavebního stavu $\alpha=0,6$. Nápravový tlak stanoven dle zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 340/2002.


Stanovený termín další hlavní prohlídky: září 2016

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Mostní list mostu pozemní komunikace					
Ev.č. mostu:	26834 - 5				
Název mostu:	Most přes potok v Brništi				
Místní název :					
Předmět přemostění :	Vodoteč (stálý průtok) Potok				
Převáděná komunikace:	3. třída / 26834				
Název převáděné komunikace :					
Staničení liniové:	7,481 km	Staničení na úseku:	0,029 km		
Rok postavení:	1955				
Rok poslední rekonstrukce :					
Kraj :	Liberecký				
Okres :	Česká Lípa				
Katastrální území:	Brniště				
Správce mostu:	kraj Liberecký/KSS Libereckého kraje/provoz Západ				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				Rok: 2002
Vn = 24 t	Vr = 48 t	Ve = 65 t	Vaj (Va) = - t		
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				Rok: 2014
Vn = 14 t	Vr = 28 t	Ve = 39 t	Vaj (Va) = 8,6 t		
Dl. přemostění: 4,5 m	Dl. nosné konst. : 6 m	Šikmost : Pravá / 72,22222 gr			
Volná šířka : 11,2 m	Celková šířka mostu : 11,5 m	Plocha mostu : 69 m2			
Nosná konstrukce					
celk.počet polí : 1					
Podrobný popis nosné konstrukce: ŽB deska prostá tl. 0.30m.					
Popis skupin polí					
Počet polí:	Světlost šikmá:	Kolmá:	Konstr.výška:	Rozpětí:	Druh stat.působení:
	m	m	m	m	
1	4,5	4,1	0,3	5,25	Deska prostá
Stavební výška : 0,6 m		Úložná výška : - m			
Způsob uložení NK					
Pozice:	Způsob uložení:	Typ:	Výrobce:	Označení:	
Mostní závěry					
Pozice:	Typ:	Výrobce:	Označení:		
Izolace desky mostovky					
Typ:	Výrobce:	Materiál:			
Spodní stavba					
Podrobný popis spodní stavby:					
Opěry					
Počet : 2	Délka: 12,4 až 12,4 m	Tloušťka: 1,5 až 1,5 m	Výška: 0 až 0 m		
Materiál: Kámen		Základy:			
Přechodová oblast:					
Mezilehlé podpěry					
Počet : 0	Délka:	Tloušťka:	Výška:	Materiál:	Základy:
Vozovka/chodníky:					

Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 8 m	Plocha vozovky: 48 m ²
Konstrukce vozovky:		
Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 1,6/1,6 m	Plocha chodníku: 19,2 m ²
Konstrukce chodníku:		
Odvodnění mostu:		
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce: Svody (dn/mat):
Záchytná zařízení		
Zábradlí (typ/délka):		
Zábradelní svodidla (typ/délka):		
Svodidla (typ/délka) :		
Jiné vybavení :		
Ostatní údaje		
Výška mostu nad terénem: 1,6 m	Výška NK nad hladinou vody: - m	
Q100: m ³ /sec.	Hladina Q100: Normální hl. vody: 0,2 m	
Souřadnice mostu		
WGS-84 N:	E:	S-JTSK X: Y:
Cizí zařízení		
Typ:	Správce:	Popis:
Správní údaje		
Archivace projektu:	Nezadaná	
Klasifikační stupeň stavu mostu:		
nosná konst.: IV - Uspokojivý	spodní stavba: V - Špatný	použitelnost: Nezadaná
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2014		
Reprodukční pořizovací hodnota		
RPH : 0,00 Kč	Datum posledního stanovení RPH: 8.8.2016	
Datum tisku ML: 8.8.2016		
Vypracoval: tisk z BMS - Bakeš Jaroslav		

Schematický náčrt mostu
(příčný řez, podélný řez, půdorys)

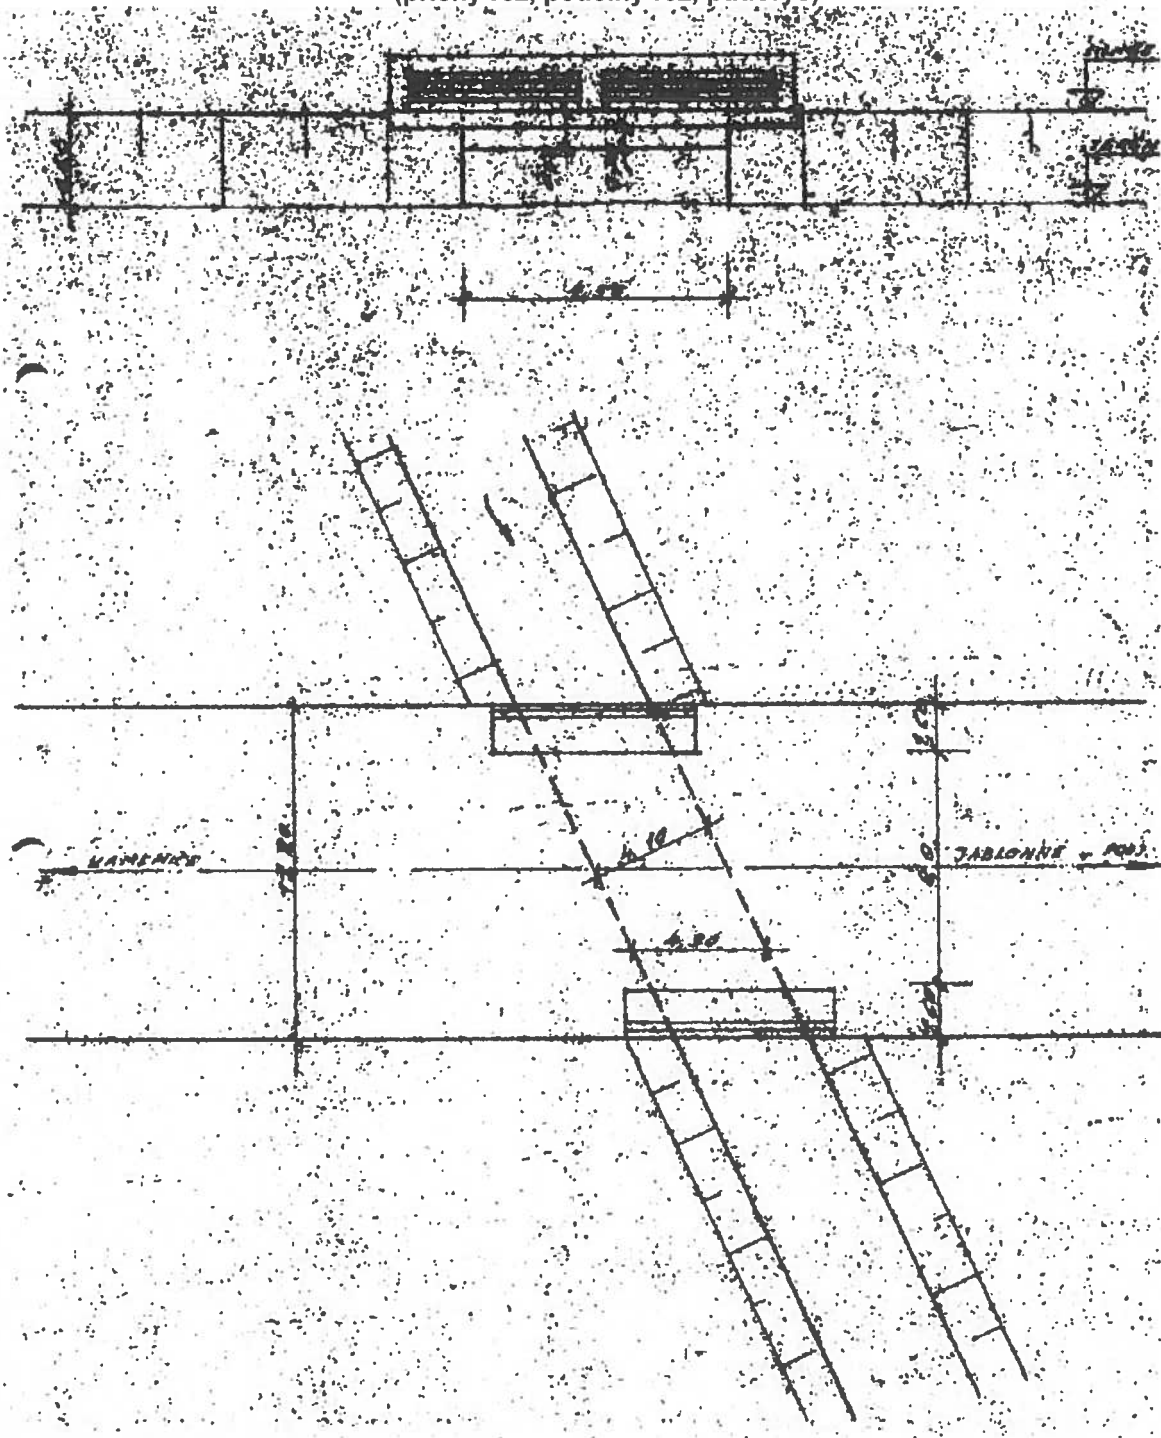

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML

Most 26834 - 6

Most přes trať ČD za Brništěm

HLAVNÍ PROHLÍDKA

□

Objekt: Most ev. č. 26834 - 6 (Most přes trať ČD za Brništěm)

Okres: Česká Lípa

Prohlídku provedla firma: Nežadáno

Prohlídku provedl: Havlíček Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky: 3.10.2013

Poznámka: Skutečný stav mostu neodpovídá mostnímu listu a ani informacím a schematům v BMS - klenba byla zrušena, jsou nové opěry. Není jasné zda jsou opěry tvořeny armovanou zeminou nebo jde o jen o obklad původních opěr. Je nutno doplnit 1HMP do BMS nebo provést kompletní diagnostiku a stavebně technický průzkum.

Počasí v době provádění prohlídky: polojasno

Teplota vzduchu: 12 °C

Teplota NK: 12 °C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 26834

Staničení km: 8,729

Ev. č. mostu: 26834 - 6

Název objektu: Most přes trať ČD za Brništěm

Staničení ve směru: Velký Valtínov

Způsob zpřístupnění:

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

0.1

Skutečný stav mostu neodpovídá mostnímu listu a ani informacím a schematům v BMS - klenba byla zrušena, jsou nové opěry. Není jasné zda jsou opěry tvořeny armovanou zeminou nebo jde o jen o obklad původních opěr. Je nutno doplnit 1HMP do BMS nebo provést kompletní diagnostiku a stavebně technický průzkum.

1. Základy mostních podpěr a křídel

1.1

Založení je pravděpodobně plošné.

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

2.1

Obklad tvoří betonové prvky. Není jasné zda jsou opěry tvořeny armovanou zeminou nebo jde o jen o obklad původních opěr.

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

3.1

Nosnou konstrukci tvoří ŽB prefabrikáty ŽMP. Mostní závěry jsou podpovrchové.

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

4.1

Vozovka je živičná. Izolační systém je pravděpodobně celoplošný, předpokládáme, že z NAIP. Chodník je na pravé římse. Římsy jsou monolitické ŽB s lícními prefabrikáty a se silničními obrubníky. Zálivky nebyly nalezeny.

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací

zařízení

- 5.1 Vpravo ocelové zábradlí ze svislou výplní, vlevo zábradelní svodidlo.

6. Cizí zařízení

- 6.1 Vpravo podél římsy na konzolách je trubní vedení.

7. Území pod mostem a přístupové cesty

- 7.1 Pod mostem je trať ČD.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

- 0.1 **Skutečný stav mostu neodpovídá mostnímu listu a ani informacím a schematům v BMS - klenba byla zrušena, jsou nové opěry. Není jasné zda jsou opěry tvořeny armovanou zeminou nebo jde o jen o obklad původních opěr. Je nutno doplnit 1HMP do BMS nebo provést kompletní diagnostiku a stavebně technický průzkum.**

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- 2.1 Oběma opěrami zatéká - výluhy na obou opěrách.

3. Nosná konstrukce

- 3.1 Podélná trhlina ve 4. nosníku zprava v celé délce podhledu, u 7. nosníku v ose mostu síťová trhlina, v 10.-13. nosníku zprava síťové a podélné trhliny.

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

- 4.1 Mostní závěry netěsní a zatéká na opěry.

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

- 5.1 Ve vozovce jsou nad opěrami příčné trhliny, krajnice jsou plné nečistot a zarostlé vegetací. Na římsách jsou smršťovací trhliny. Chybí těsnění spár říms. Zálivky nebyly nalezeny.

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

- 8.1 Zábradelní svodidlo je nárazem zdeformované. Zábradlí i svodidlo korodují. Chybí ev.č. mostu.

11. Území pod mostem a přístupové cesty

- 11.1 Terén pod mostem je obtížně přístupný po zarostlých svazích drážního zářezu. Nejsou revizní schodiště. Eroze svahů podél křídel.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

- Čistit svahy od vegetace.
- Čistit krajnice a římsy od nečistot a vegetace.

5.odstranění nutno provést ihned

- Doplnit ev.č. mostu.
- **Provést opravu zábradelního svodidla.**

3.odstranění nutno do 1 roku

- Obnovit PKO zábradlí a svodidla.
- Trhliny ve vozovce nad opěrami utěsnit. V krytu proříznout spáru s pružnou zálivkou. Trhliny v římsě uzavřít injektáží.
- **Skutečný stav mostu neodpovídá mostnímu listu a ani informacím a schématům v BMS - klenba byla zrušena, jsou nové opěry. Není jasné zda jsou opěry tvořeny armovanou zeminou nebo jde o jen o obklad původních opěr. Je nutno doplnit 1HMP do BMS nebo provést kompletní diagnostiku a stavebně technický průzkum.**

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :15.10.2013

Poznámka :

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:
III - Dobrý $a = 1$

Nosná konstrukce

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:
III - Dobrý $a = 1$

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

$V_n = 32 \text{ t}$

$V_r = 80 \text{ t}$

$V_e = 196 \text{ t}$

Použitelnost: Nezadaná

Maximální nápravový tlak = 12,0 t

Převzato z BMS

Stanovený termín další hlavní prohlídky: srpen 2019

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.



Pohled proti staničení




Zleva - kde je ta klenba z BMS a ML?



OP1



OP2

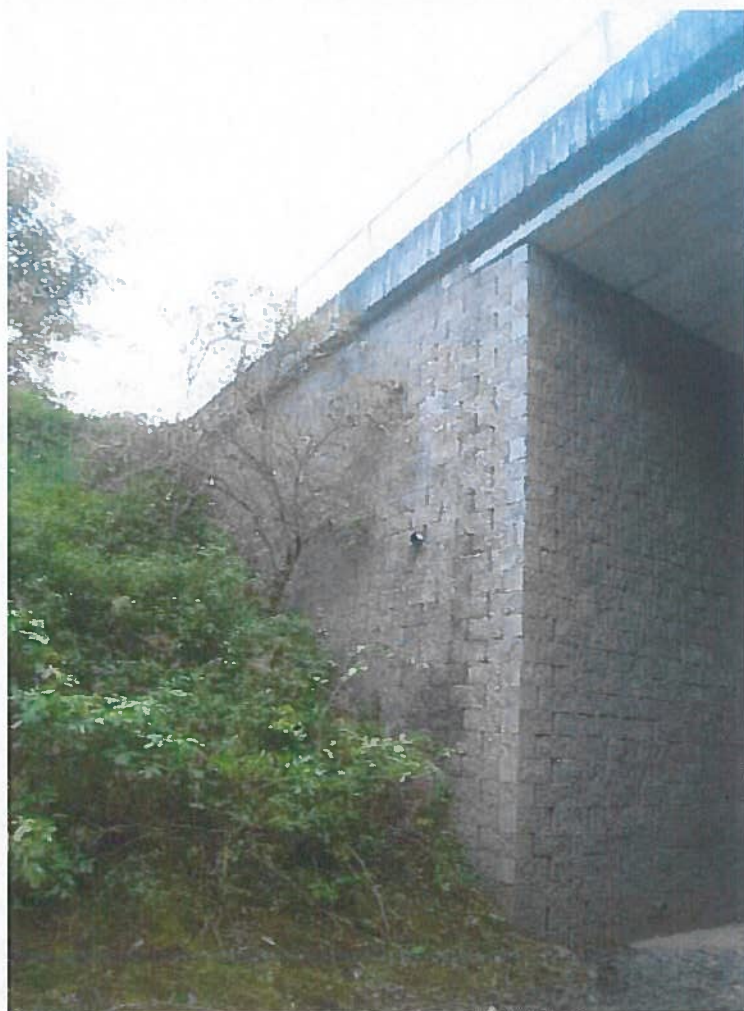


Křídlo OP2 L



Dtto - zatékání a výluhy



Podhled NK

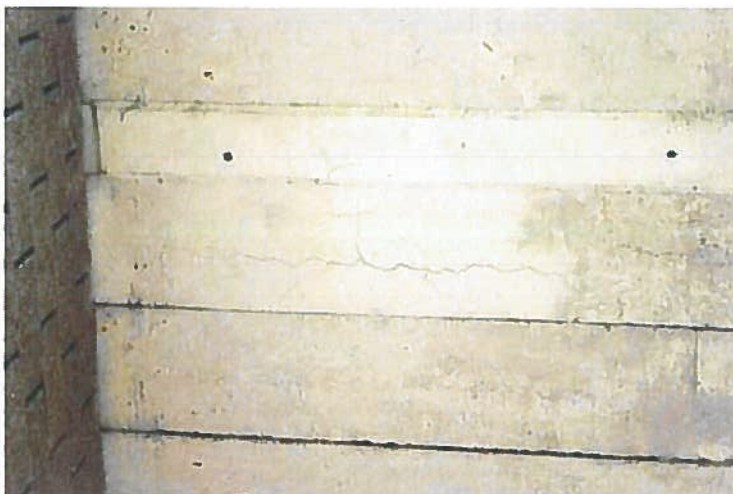

Trhliny na pohledu NK



Zarostlé římsy a krajnice.



Stav zábradelního svodidla.



Stav PKO





Stav svahu u křídla

Mostní list mostu pozemní komunikace					
Ev.č. mostu:	26834 - 6				
Název mostu:	Most přes trať ČD za Brništěm				
Místní název :					
Předmět přemostění :	Železnice, vlečka				
Převáděná komunikace:	3. třída / 26834				
Název převáděné komunikace :					
Staničení liniové:	8,729 km	Staničení na úseku:	1,277 km		
Rok postavení:	1995				
Rok poslední rekonstrukce :					
Kraj :	Liberecký				
Okres :	Česká Lípa				
Katastrální území:	Brniště				
Správce mostu:	kraj Liberecký/KSS Libereckého kraje/provoz Západ				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení: V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)					
Rok: 2002					
Vn = 40 t	Vr = 107 t	Ve = 356 t	Vaj (Va) = - t		
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)					Rok: 2013
Vn = 32 t	Vr = 80 t	Ve = 196 t	Vaj (Va) = 12 t		
Dl. přemostění: 5,6 m	Dl. nosné konst. : 7,5 m Šikmost : Kolmý / 100 gr				
Volná šířka : 6,4 m	Celková šířka mostu : 8 m		Plocha mostu : 60 m ²		
Nosná konstrukce					
celk.počet polí : 1					
Podrobný popis nosné konstrukce: Klenba z kamene tl. 0.80m. 16ks ŽB PREFA nosníků ŽMP, dl. 7.5m.					
Popis skupin polí					
Počet polí:	Světlost šikmá:	Kolmá:	Konstr.výška:	Rozpětí:	Druh stat.působení:
	m	m	m	m	
1	5,6	5,6	0,8	-	Klenba
Stavební výška : 1,2 m		Úložná výška : - m			
Způsob uložení NK					
Pozice:	Způsob uložení:	Typ:	Výrobce:	Označení:	
Mostní závěry					
Pozice:	Typ:	Výrobce:	Označení:		
Izolace desky mostovky					
Typ:	Výrobce:	Materiál:			
Spodní stavba					
Podrobný popis spodní stavby:					
Opěry					
Počet : 2	Délka: 6,4 až 6,4 m	Tloušťka: 1,5 až 1,5 m	Výška: 3,3 až 3,3 m		
Materiál: Kámen		Základy:			
Přechodová oblast:					

Mezilehlé podpěry				
Počet : 0	Délka: Tloušťka:	Výška:	Materiál:	Základy:
Vozovka/chodníky:				
Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 6,4 m	Plocha vozovky: 48 m2		
Konstrukce vozovky:				
Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: -/- m	Plocha chodníku: 0 m2		
Konstrukce chodníku:				
Odvodnění mostu:				
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat).:	
Záchytná zařízení				
Zábradlí (typ/délka):				
Zábradelní svodidla (typ/délka):				
Svodidla (typ/délka) :				
Jiné vybavení :				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 7,4 m		Výška NK nad hladinou vody: - m		
Q100: m3/sec.	Hladina Q100: Normální hl. vody: - m			
Souřadnice mostu				
WGS-84 N:	E:	S-JTSK	X:	Y:
Cizí zařízení				
Typ:	Správce:	Popis:		
Správní údaje				
Archivace projektu:	Nezadaná			
Klasifikační stupeň stavu mostu:				
nosná konst.: III - Dobrý	spodní stavba: III - Dobrý		použitelnost: Nezadaná	
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2013				
Reprodukční pořizovací hodnota				
RPH : 0,00 Kč	Datum posledního stanovení RPH: 8.8.2016			
Datum tisku ML: 8.8.2016		Vypracoval: tisk z BMS - Bakeš Jaroslav		

Schematický náčrt mostu
(příčný řez, podélný řez, půdorys)

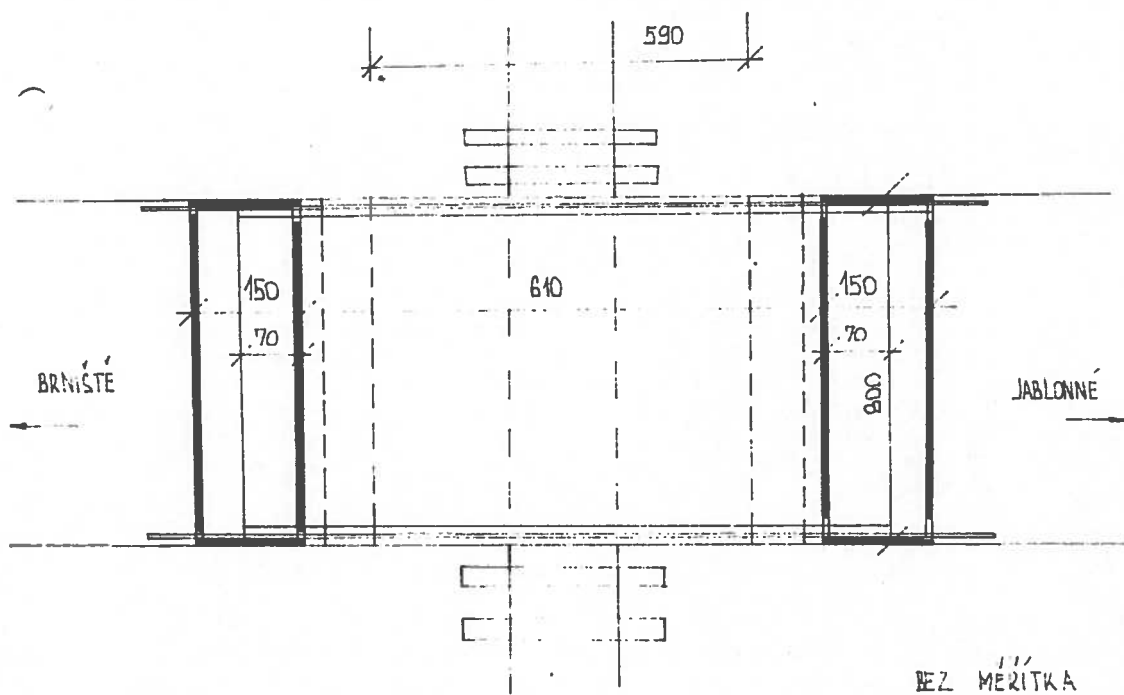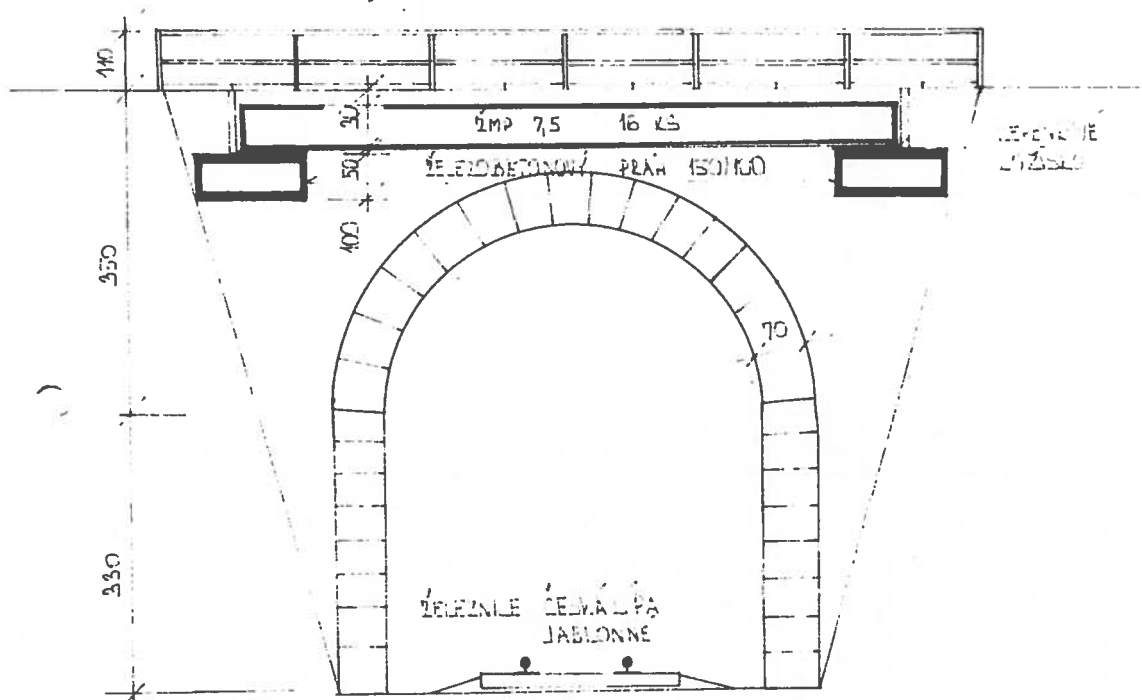

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML

Most 26834 - 7

Most přes potok za Brništěm

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev. č. 26834 - 7 (Most přes potok za Brništěm)

Okres: Česká Lípa

Prohlídku provedla firma: Nežadáno

Prohlídku provedl: Ehrenberger Jiří, Ing.

Datum provedení prohlídky: 1.9.2014

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Teplota vzduchu: 14 °C

Teplota NK: 11 °C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 26834

Staničení km: 8,942

Ev. č. mostu: 26834 - 7

Název objektu: Most přes potok za Brništěm

Staničení ve směru: komunikace

Způsob zpřístupnění:

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 1.1 | Mostní podpěry
- Opěry | Založení mostu není přístupné. S ohledem na stáří objektu se předpokládá plošné založení opěr mostu na vrstvách náplavových sedimentů. Základovou desku na levé straně mostu, v místě rozšíření, tvoří spodní rámová příčel uzavřených rámových prefabrikátů typu BENEŠ. |
|-----|---------------------------|--|

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 2.1 | Mostní podpěry
- Opěry | Opěry mostu jsou z hrubého řádkového zdiva z pískovcových kvádrů. Opěry na levé straně mostu tvoří, v místě rozšíření, železobetonové stojiny uzavřených rámových prefabrikátů typu BENEŠ. |
| 2.2 | Křídla | Na levé straně mostu, v místě rozšíření, jsou provedena monolitická křídla, pravděpodobně ze slabě vyztuženého betonu. Na pravé straně mostu jsou provedena kamenná křídla zděná z hrubých pískovcových kvádrů. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

- | | | |
|-----|--|---|
| 3.1 | Čelní zdi | Poprsní zdi klenbové konstrukce jsou kamenné, z řádkového zdiva z hrubých pískovcových kvádrů. |
| 3.2 | Nosná konstrukce
- Konstrukce rozšíření | Nosnou konstrukci rozšíření mostu tvoří horní rámová příčel uzavřených rámových prefabrikátů typu BENEŠ. V příčném směru je konstrukce sestavena celkem z 4ks prefabrikátů světlé šířky 2,00m a výšky 2,00m. |
| 3.3 | Nosná konstrukce
- Klenbová konstrukce | Nosnou konstrukci mostu tvoří kamenná segmentová klenba z pískovcových kvádrů. Nosná konstrukce mostu je provedena jako přesypaná, minimální výška přesypávky je přibližně 1,10m včetně konstrukce vozovky ve vrcholu klenby. |

3.4	Mostní závěry	S ohledem na typ a rozpětí nosné konstrukce je most proveden bez mostních závěrů.
4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky		
4.1	Vozovka	Na mostě je proveden vozovka s živičným krytem, předpokládána tloušťka konstrukce vozovky do 100mm.
4.2	Izolační systém	S ohledem na typ a stáří konstrukce se předpokládá, že je konstrukce provedena bez izolace. Případně byla izolace provedena pouze těsnicí jílovou vrstvou. Na levé straně mostu, v místě rozšíření, se předpokládá celoplošná izolace z natavovaných asfaltových izolačních pásů (NAIP). Izolace mostu je provedena bez odvodňovačů izolace.
4.3	Římsy	Na levé okraji mostu je provedena monolitická železobetonová římsa, na pravém okraji je římsa tvořena kamennými kvádry.
5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení		
5.1	Záchytná zařízení	Na levé straně mostu je osazeno ocelové trubkové zábradlí. Na pravé straně mostu je provedeno atypické zábradlí tvořené železobetonovými sloupky a dvojicí vodorovných ocelových madel, horní madlo trubkové, dolní L profil.
6. Cizí zařízení		
6.1	Vedení, chráničky	Na mostě nejsou viditelná žádná vedení ani žádné chráničky cizích zařízení jiných správců.
7. Území pod mostem a přístupové cesty		
7.1	Území pod mostem	Dno vodoteče pod mostem je zpevněno dlažbou do štěrkopískového lože, bez koncových prahů a bez spárování.
7.2	Přístupové cesty	Most je dobře přístupný po svazích tělesa převáděné komunikace.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

1.1	Základy mostních podpěr a křídel	Základy opěr a ani rámová konstrukce rozšíření nevykazují žádné závady signalizující poruchy založení mostu.
	- Opěry	

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

2.1	- Opěry	V patě opěr klenbové konstrukce dochází v úrovni kolísání hladiny vody k vymílání výplně spár kamenného zdiva, na pravé straně mostu jsou v patách obou opěr vypadlé kameny. Lokálně je vypadané spárování zdiva opěr, pískovec zdiva povrchově degraduje. Povrch opěr je vlhký a porostlý mechem. Dodatečně provedená ochrana pat opěr je rozpadlá a neplní svou funkci.
2.2	Křídla	Beton křídel na levé straně mostu je povrchově degradován, stopy po průsacích a zatékání s výluhy. Zdivo kamenných křídel na pravé straně mostu má lokálně vypadané spárování zdiva, ve spárách je uchycená vegetace, pískovec zdiva

povrchově degraduje.

3. Nosná konstrukce

3.1

- Klenbová
konstrukce

V podhledu klenby jsou ve spárování kamenného zdiva patrné podélné trhliny, nejvýraznější trhliny jsou v místě napojení klenbové konstrukce na rámovou konstrukci rozšíření mostu. Lokálně je vypadané spárování zdiva klenby, pískovec zdiva povrchově degraduje. Povrch klenby je vlhký a porostlý mechem.

3.2

- Rámová
konstrukce

Povrch betonu rámové konstrukce je vlhký a porostlý mechem, zejména nad hladinou vody a v místě napojení na křídla. V podhledu je lokálně obnažená korodující výztuž.

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

5.1

Vozovka

V předpolích jsou na levé straně mostu, v místě rozšíření, patrné poklesy vozovky, je zde patrná podélná spára s opravami. Krajinice komunikace jsou zanesené a je zde uchycena vegetace.

5.2

Římsy

Povrch betonu levé římsy je plošně degradován, římsa je vlhká, je na ní uchycená vegetace, mech. Zdivo pravé kamenné římsy je rozvolněné, vypadlé spárování, ve spárách je uchycená vegetace.

6. Izolační systém

6.1

Izolační systém na klenbové konstrukci zřejmě chybí, nebo je už zcela nefunkční. Izolace na rámové konstrukci, na levé straně mostu, bez zjevných závad.

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

8.1

Zábradlí

Trubkové zábradlí na levé straně mostu plošně koroduje. Železobetonové sloupky zábradlí na pravé straně mostu jsou deformované a potřhané, vodorovná výplň je plošně napadena korozi. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu zábradlí nevyhovují požadavkům platných předpisů.

8.2

Označení mostu

Chybí evidenční čísla mostu.

8.3

Dopravní značení

Chybí svislé dopravní značení s vyznačením zatížitelnosti mostu.

11. Území pod mostem a přístupové cesty

11.1

Území pod mostem

Zpevnění dna vodoteče pod klenbovou konstrukcí je značně rozpadlé, zejména v místě příčného prahu vpravo na výtok.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

- Osadit tabulky s evidenčním číslem mostu.
- Osadit svislé dopravní značení s vyznačením zatížitelnosti mostu.

3.odstranění nutno do 1 roku

- Dozdít kaverny v kamenném zdivu opěr, obnovit ochranu pat opěr klenbové konstrukce.

2.odstranění nutno do 5 let

- S ohledem na stavební stav spodní stavby a nosné konstrukce klenbové části mostu doporučujeme zahájit přípravu celkové rekonstrukce mostu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :26.9.2014

Poznámka :

O výsledku hlavní prohlídky mostu byl informován zodpovědný zástupce správce objektu - Krajské správy silnic Libereckého kraje - Tomáš Machalík, vedoucí mostmistr.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:

VI - Velmi špatný $a = 0,4$

Nosná konstrukce

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:

VI - Velmi špatný $a = 0,4$

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

$V_n = 10 \text{ t}$

$V_r = 26 \text{ t}$

$V_e = 92 \text{ t}$

R - hodnota zatížitelnosti je po redukci vzhledem ke stavu mostu

Použitelnost: Nezadaná

Maximální nápravový tlak = 7,5 t

Zatížitelnost mostu byla převzata z předchozí HPM a redukována stupněm stavebního stavu $\alpha=0,4$. Nápravový tlak stanoven dle zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 340/2002.


Stanovený termín další hlavní prohlídky: září 2016

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Mostní list mostu pozemní komunikace					
Ev.č. mostu:	26834 - 7				
Název mostu:	Most přes potok za Brništěm				
Místní název :					
Předmět přemostění :	Vodoteč (stálý průtok) Potok				
Převáděná komunikace:	3. třída / 26834				
Název převáděné komunikace :					
Staničení liniové:	8,942 km	Staničení na úseku:	1,490 km		
Rok postavení:	9999				
Rok poslední rekonstrukce :					
Kraj :	Liberecký				
Okres :	Česká Lípa				
Katastrální území:	Velký Valtinov				
Správce mostu:	kraj Liberecký/KSS Libereckého kraje/provoz Západ				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení: V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)					
Rok: 2002					
Vn = 24 t	Vr = 64 t	Ve = 231 t	Vaj (Va) = - t		
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)					Rok: 2014
Vn = 10 t	Vr = 26 t	Ve = 92 t	Vaj (Va) = 7,5 t		
Dl. přemostění: 2,8 m	Dl. nosné konst. : 3,4 m Šikmost : Levá / 72,22222 gr				
Volná šířka : 7 m	Celková šířka mostu : 7,5 m		Plocha mostu : 25,5 m2		
Nosná konstrukce					
celk.počet polí : 1					
Podrobný popis nosné konstrukce: Klenba z kamene tl. 0.30m.					
Popis skupin polí					
Počet polí:	Světlost šikmá:	Kolmá:	Konstr.výška:	Rozpětí:	Druh stat.působení:
	m	m	m	m	
1	2,8	2,5	0,3	3,1	Klenba
Stavební výška : 1,4 m		Úložná výška : - m			
Způsob uložení NK					
Pozice:	Způsob uložení:	Typ:	Výrobce:	Označení:	
Mostní závěry					
Pozice:	Typ:	Výrobce:	Označení:		
Izolace desky mostovky					
Typ:	Výrobce:	Materiál:			
Spodní stavba					
Podrobný popis spodní stavby:					
Opěry					
Počet : 2	Délka: 7,8 až 7,8 m	Tloušťka: 1 až 1 m	Výška: 0 až 0 m		
Materiál: Kámen		Základy:			
Přechodová oblast:					
Mezilehlé podpěry					
Počet : 0	Délka:	Tloušťka:	Výška:	Materiál:	Základy:

Vozovka/chodníky:			
Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 6 m	Plocha vozovky: 20,4 m ²	
Konstrukce vozovky:			
Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 1/- m	Plocha chodníku: 3,4 m ²	
Konstrukce chodníku:			
Odvodnění mostu:			
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat):
Záchytná zařízení			
Zábradlí (typ/délka):			
Zábradelní svodidla (typ/délka):			
Svodidla (typ/délka) :			
Jiné vybavení :			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2,8 m		Výška NK nad hladinou vody: - m	
Q100: m ³ /sec.	Hladina Q100: Normální hl. vody: 0,3 m		
Souřadnice mostu			
WGS-84 N:	E:	S-JTSK	X: Y:
Cizí zařízení			
Typ:	Správce:	Popis:	
Správní údaje			
Archivace projektu:		Nezadaná	
Klasifikační stupeň stavu mostu:			
nosná konst.: VI - Velmi špatný		spodní stavba: VI - Velmi špatný	použitelnost:
Nezadaná			
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2014			
Reprodukční pořizovací hodnota			
RPH : 0,00 Kč		Datum posledního stanovení RPH: 8.8.2016	
Datum tisku ML: 8.8.2016		Vypracoval: tisk z BMS - Bakeš Jaroslav	

Schematický náčrt mostu
(příčný řez, podélný řez, půdorys)

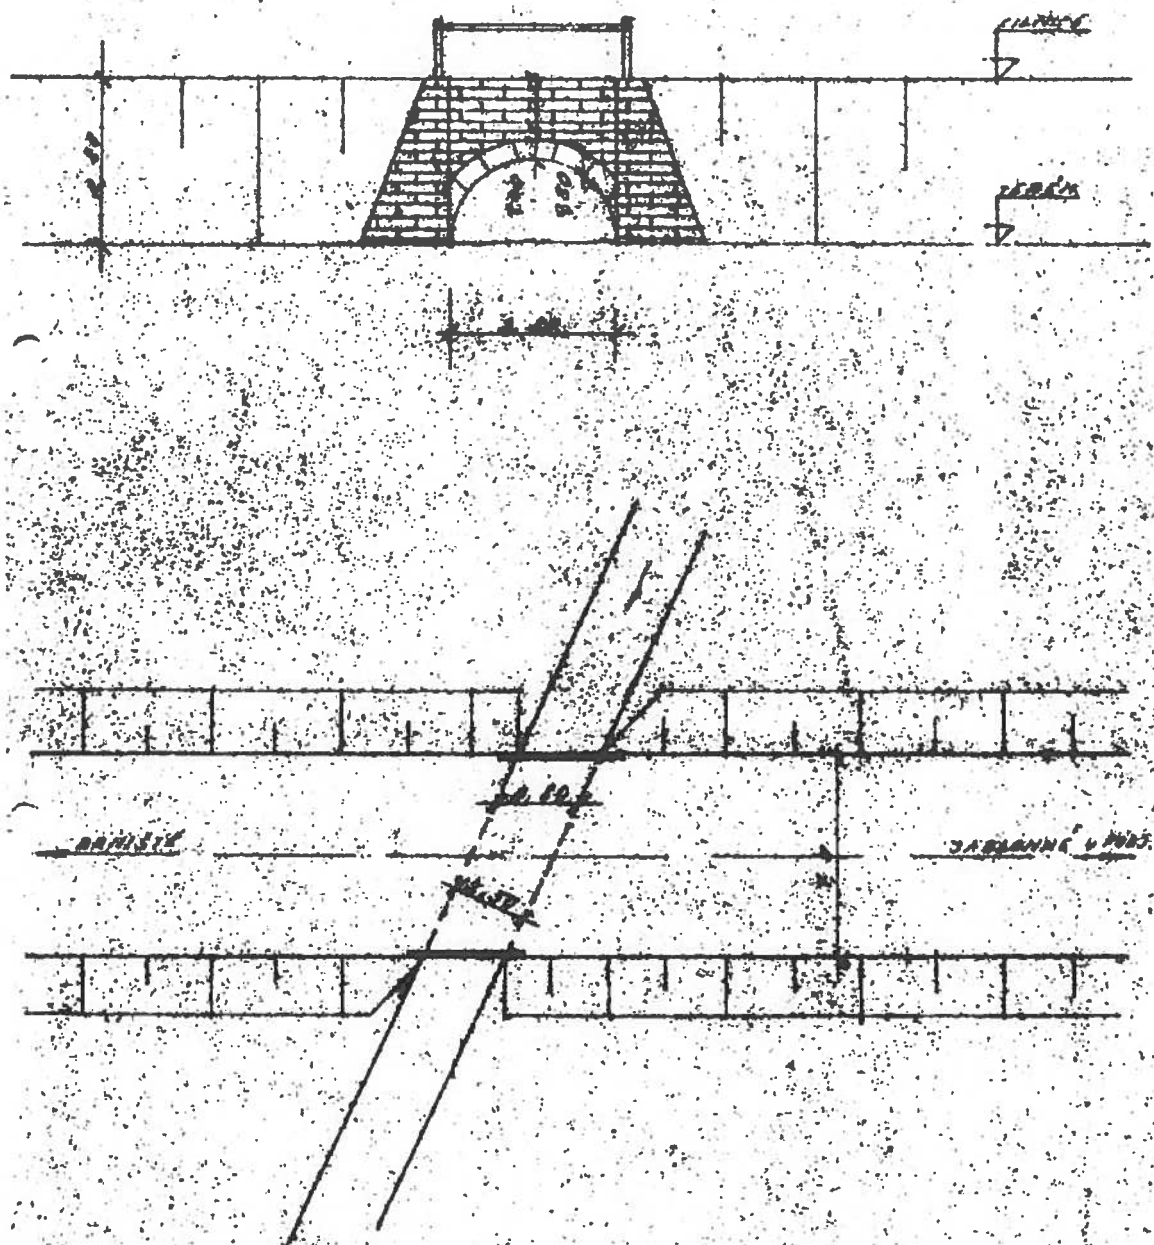

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML

Most 26834-8

Most přes Panenský potok ve Františkově

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 26834-8 (Most přes Panenský potok ve Františkově)

Okres: Česká Lípa

Prohlídku provedla firma: Nežadáno

Prohlídku provedl: Bálik Igor, Ing.

Datum provedení prohlídky: 3.11.2016

Poznámka:

Prohlídku mostu provedl Ing.I.Bálik (č. oprávnění 113/2006) -AF-CITYPLAN s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec

Počasí v době provádění prohlídky:

Oblačno

Způsob zpřístupnění:

Přístup pod most po svazích vodoteče.

Teplota vzduchu: 13.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 26834

Staničení km: 11.840km

Ev.č.mostu: 26834-8

Název objektu: **Most přes Panenský potok ve Františkově**

Staničení ve směru: ve směru staničení komunikace

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|--|
| [1.1] | 1 | Spodní stavba | Původní most vybudován roku 1890 - kamenná spodní stavba a patrně ocelové nosníky. V 70. letech vyměněna nosná konstrukce za prefabrikované nosníky ŽMP 62, původní spodní stavba ponechána. |
| [1.2] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Založení mostu nepřístupné, patrně plošné nebo na dřevěných pilotách. |
| [1.3] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla | Opěry mostu, pilíř a křídla jsou masivní, zděné kamenné z pískovcových kvádrů různé velikosti. Křídla šikmá k ose mostu. V místech otvorů pro osazení původních nosníků opěry dozděny smíšeným zdívem. |

2. Nosná konstrukce

- | | | | |
|-------|---|------------------|---|
| [2.1] | 2 | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce o dvou polích tvořena prostými deskami z prefabrikovaných nosníků ŽMP 62. Na podporách NK uložena na vrstvu lepenky, mostní závěry nejsou provedeny. |
|-------|---|------------------|---|

3. Mostní svršek

- | | | | |
|-------|-------|--------------------------|---|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | Vozovka na mostě živičná. |
| [3.2] | 3.3.1 | Římsa | Na mostě provedeny oboustranné monolitické ŽB římsy |
| [3.3] | 3.5 | Izolační systém mostovky | Izolační systém patrně celoplošný NAIP. |

4. Vybavení mostu

[4.1]	4.2	Zábradlí	Na mostě osazeno oboustranné ocelové trubkové zábradlí s vodorovnou výplní zabetonované do římsy.
[4.2]	4.3	Dopravní značení, označení mostu	Před mostem osazeny značky začátku/konce obce.
[4.3]	4.6	Území pod mostem a přístupové cesty	Pod mostem se nachází nezpevněné koryto Panenského potoka.
[4.4]	4.7	Cizí zařízení na mostě	Vlevo podél mostu nadzemní kabelové vedení, patrně silové, ve vzdálenosti cca 5 m od mostu.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1]	1.1	Základy mostních podpěr a křídel	Založení mostu nepřístupné, konstrukce nevykazuje závady spojené s poruchami založení. Svahy koryta vodoteče nezpevněné, v blízkosti mostu uchyceny dřeviny.
[1.2]	1.2	Mostní podpěry a křídla	Na opěrách a pilířích lokálně vydrolené spárování (v úrovni hladiny vodoteče a na bocích opěr a pilířů), vpravo na opěře 1 chybí v patě jeden kvádr. V hlavě pilíře z boku uchycena vegetace. Na bocích NK mírné zatíkáání na úložné prahy. Zdivo úložných prahů v místech původních nosníků méně kvalitní, v době prohlídky bez zatékání a významných statických poruch. Křídla mostu plošně s vypadaným spárováním, ve spárách uchycena vegetace. V patě křídel zdivo rozvolněné.

2. Nosná konstrukce

[2.1]	2	Nosná konstrukce	Na krajní nosníky mostu na obou stranách zatéká, a to jak z boku přes římsy (výrazně), tak spárou mezi krajními a sousedními nosníky. Boky NK jsou degradované, vpravo nad pilířem obnažena korodující horní podélná výztuž nosníků. Na podélných dobetonávkách nosníků uchycena vegetace. Na spodním povrchu nosníků (zejména krajních) obnažena korodující příčná a lokálně i podélná výztuž. Výraznější je degradace betonu a koroze výztuže v blízkosti podélných pár nosníků.
-------	---	------------------	--

3. Mostní svršek

[3.1]	3.1	Vozovka	Vozovka na mostě mnohokrát opravovaná, kryt vozovky porušen řadou trhlin a vysprávek. V krajnicích mostu silná vrstva nečistot s uchycenou vegetací.
[3.2]	3.3.1	Římsa	Římsy na mostě degradované, dobetonávka pod římsami porušena degradací až do hloubky 15 cm. Přes římsy zatéká na boky nosné konstrukce.

[3.3]	3.5	Izolační systém mostovky	Lokálně porušen (nad krajními nosníky) do podélných spár krajních nosníků zatéká.
-------	-----	--------------------------	---

4. Vybavení mostu

[4.1]	4.2	Zábradlí	Na mostě je osazeno dvoumadlové ocelové zábradlí, které nevyhovuje platným předpisům pro zachytňý systém na mostě, navíc mimo obec. Na zábradlí lokálně porušen systém PKO s následným vznikem a rozvojem koroze.
[4.2]	4.3	Dopravní značení, označení mostu	Na mostě nejsou osazeny značky omezující zatížitelnost mostu a tabulky s ev. č. mostu. Stanovené zatížitelnosti mostu jsou nepravděpodobné, doporučuji prověřit výpočtem.
[4.3]	4.6	Území pod mostem a přístupové cesty	Koryto pod mostem v době prohlídky znečištěno, v prvním otvoru uchycen splavený kmen stromu. Přístup pod most obtížný z břehu vodoteče, hloubka vody cca 1 m.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

[1]	4.3	Dopravní značení, označení mostu	Osadit dopravní značky omezující zatížitelnost mostu a tabulky s ev. č. mostu.
[2]	4.3	Dopravní značení, označení mostu	Omezit rychlost na mostě na max. 60 km/hod za účelem legalizace osazeného zachytňého systému

3.odstranění nutno do 1 roku

[3]	2	Nosná konstrukce	Připravit a provést celkovou opravu mostu spočívající v odstranění stávajícího mostního svršku, vč. izolace, opravy spodní stavby, nosné konstrukce a provedení nového svršku. V případě nutnosti vyměnit krajní nosníky nebo zřídit novou nosnou konstrukci, pravděpodobně betonovou monolitickou desku.
-----	---	------------------	---

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 3.11.2016

Číslo jednací:

Poznámka:

Závěry z hlavní prohlídky a opatření byla projednána s mostmistrem p. Machálíkem.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba

Stavební stav:

V - Špatný (koefic. $a=0.6$)

Nosná konstrukce

Stavební stav:

V - Špatný (koefic. $a=0.6$)

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Poznámka ke stavu

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

$V_n = 33t$

$V_r = 36t$

$V_e = 48t$

Max.nápravový tlak = 12.0t

Poznámka k zatížitelnosti

Hodnoty zatížitelnosti převzaty z předchozí HPM. Hodnoty nepravděpodobné, zejména výjimečná zatížitelnost.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2018

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Celkový pohled ve směru staničení



Celkový pohled proti směru staničení



Pohled na levou stranu konstrukce



Pohled na pravou stranu konstrukce



Pohled na OP1, lokálně vypadlé spárování



Pohled na PI2, lokálně vypadlé spárování, rozpad kamenů v místě uložení



Pohled na OP3, trhliny a rozvolnění opěry



Podhled NK pole1



Podhled NK pole2



Degradace betonu římsy,
uchycená vegetace, trhlina na PI
na pravé straně



Degradace betonu římsy,
nečistoty na kraji vozovky, lokální
koroze zábradlí



Trhliny ve vozovce

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	26834-8		
Název mostu:	Most přes Panenský potok ve Františkově		
Místní název:	Most-Velký Valtinov		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 26834		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	11.840 km	Staničení na úseku: 1.233 km	
Rok postavení:	1969		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Liberecký		
Okres:	Česká Lípa		
Obec (MČ):	Velký Valtinov		
Katastrální území:	Velký Valtinov		
Správce mostu:	kraj Liberecký, KSS Libereckého kraje, provoz Západ		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 33$ t	$V_r = 36$ t	$V_e = 48$ t	$V_{aj}(V_a) = 12.0$ t Rok: 2016
Základní údaje			
Celkový počet polí: 2	Délka přemostění: 12.00 m	Délka NK: 12.40 m	
Šikmost: Pravá 83.33 g	Volná šířka: 6.60 m	Celková šířka mostu: 7.10 m	
Plocha mostu: 88.04 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -709946 Y: -973043	WGS: 50.750466°N 14.747439°E	
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:	ŽB PREFA nosníky ŽMP-62, dl. 6m, v. 0.50m.		
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.50 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
Q ₁₀₀ : -	Normální hladina vody: 0.50 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 6.90 až 6.90 m	Šířka: 1.20 až 1.20 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 2		
	Šikmá světlost: 5.60 m	Kolmá světlost: 5.40 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: 5.80 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP-62		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.60 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové zábradlí.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný


Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 3.11.2016

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Datum tisku: 4.4.2017 12:58 Vytisknul z BMS: - Machalík Tomáš

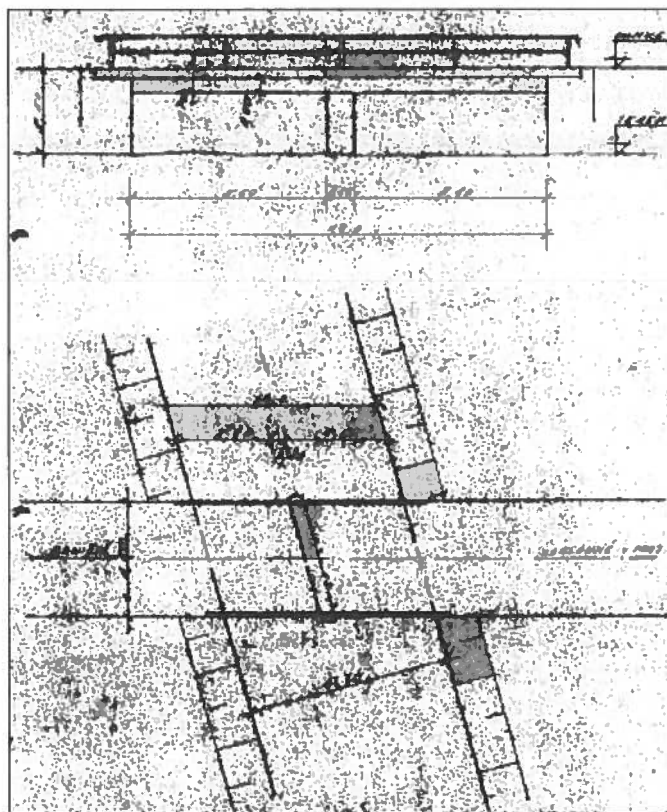

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML

Most 26834-9

Most přes náhon ve Františkově

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 26834-9 (Most přes náhon ve Františkově)

Okres: Česká Lípa

Prohlídku provedla firma: Nežadáno

Prohlídku provedl: Bálik Igor, Ing.

Datum provedení prohlídky: 3.11.2016

Poznámka:

Prohlídku mostu provedl Ing.I.Bálik (č. oprávnění 113/2006) -AF-CITYPLAN s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec

Počasí v době provádění prohlídky:

Oblačno

Způsob zpřístupnění:

Přístup pod most po svazích vodoteče.

Teplota vzduchu: 13.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 26834

Staničení km: 11.889km

Ev.č.mostu: 26834-9

Název objektu: **Most přes náhon ve Františkově**

Staničení ve směru: ve směru staničení komunikace

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Založení mostu je plošné. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla | Opěry masivní, zdivo z kamenných pískovcových kvádrů (z roku 1891). Křídla šikmá, z kamenných kvádrů. |

2. Nosná konstrukce

- | | | | |
|-------|---|------------------|--|
| [2.1] | 2 | Nosná konstrukce | Nosnou konstrukci tvoří 7kusů železobetonových prefa ŽMP šířky 1.0m. Ložiska nejsou, nosná konstrukce je uložena na lepence. |
|-------|---|------------------|--|

3. Mostní svršek

- | | | | |
|-------|-------|--------------------------|--|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | Vozovka na mostě živičná. |
| [3.2] | 3.3.1 | Římsa | Římsy z monolitického železobetonu. |
| [3.3] | 3.5 | Izolační systém mostovky | Hydroizolace pravděpodobně živičné pásy. |
| [3.4] | 3.6 | Odvodnění mostu | |

4. Vybavení mostu

- | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|--|
| [4.1] | 4.2 | Zábradlí | Zábradlí ocelové trubkové dvoumadlové. |
| [4.2] | 4.3 | Dopravní značení, označení mostu | |

[4.3]	4.6	Území pod mostem a přístupové cesty	Pod mostem vodoteč.
[4.4]	4.7	Cizí zařízení na mostě	Vlevo podél mostu vzdušné vedení, podzemní sítě nezjišťovány.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1]	1.2	Mostní podpěry a křídla	Ve zdivu opěr jsou svislé a šikmé trhliny, uvolněné spárování zdiva, na okrajích obou opěr kvádry vytlačené z líce zdiva cca o 1cm. V úrovni vodoteče vymleté spárování opěr, na vtoku i výtoku místy vymlety i kusy pískovcových kvádrů. Křídla vlevo u opěry 2 je zdivo křídla rozvolněné, vpravo byl do křídla těsně u opěry vrostlý strom, jehož kořenový systém znovu obráží a narušuje zdivo křídla i opěry.
-------	-----	-------------------------	--

2. Nosná konstrukce

[2.1]	2	Nosná konstrukce	V podhledu nosné konstrukce lokálně korodující výztuž, vlevo na krajním nosníku odpadlá krycí vrstva betonu ve větší tl.a rozsahu. U obou krajních nosníků stopy po zatékání na boky N.K, beton na bocích nosné konstrukce a říms se odlupuje a rozpadá.
-------	---	------------------	---

3. Mostní svršek

[3.1]	3.1	Vozovka	Na okrajích vozovky nános nečistot, povrch vozovky s výtluky a trhlinami, záplatovaný. Niveleta vozovky před opěrou 1 a za opěrou 2 je pokleslá.
[3.2]	3.3.1	Římsa	Beton říms je silně degradován.
[3.3]	3.5	Izolační systém mostovky	Hydroizolace mostu je na obou okrajích nefunkční.
[3.4]	3.6	Odvodnění mostu	Odvodnění vozovky není provedeno, voda z povrchu stéká vlevo před a za římsu, kde je pokleslý kužel násypu.

4. Vybavení mostu

[4.1]	4.2	Zábradlí	Zábradlí povrchově koroduje, odpadává ochranný nátěr.
[4.2]	4.3	Dopravní značení, označení mostu	Označení mostu chybí. Chybí vyznačení zatížitelnosti.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

- | | | | |
|-----|-----|-------------------------|---|
| [1] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla | Očistit most a křídla od vegetace a dřevin. |
|-----|-----|-------------------------|---|

5.odstranění nutno provést ihned

- | | | | |
|-----|-----|----------------------------------|---|
| [2] | 4.3 | Dopravní značení, označení mostu | Osadit značky s vyznačením zatížitelnosti. Osadit tabulky s ev.č. mostu |
|-----|-----|----------------------------------|---|

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | | |
|-----|-----|-------------------------|---|
| [3] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla | Vyspravit a vyspárovat poškozená místa ve spodní stavbě. |
| [4] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla | Vzhledem ke stavebnímu stavu spodní stavby doporučuji připravit celkovou rekonstrukci mostu . |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 3.11.2016

Číslo jednací:

Poznámka:

Závěry z hlavní prohlídky a opatření byla projednána s mostmistrem p. Machálíkem.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Zatížitelnost

Spodní stavba

Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

VI - Velmi špatný (koef. $a=0.2$)

$V_n = 17t$

Nosná konstrukce

$V_r = 18t$

Stavební stav:

$V_e = 24t$

V - Špatný (koef. $a=0.4$)

Max.nápravový tlak = 12.0t

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Poznámka ke stavu

Poznámka k zatížitelnosti

Zatížitelnost mostu je převzata z předchozí HMP a redukována souč. stavebního stavu. Nápravový tlak stanoven dle ČSN 73 6222, čl. 5.1.10 s ohledem na únosnost vozovky na maximální hodnotu 12t.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2018

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Celkový pohled ve směru staničení



Celkový pohled proti směru staničení



Pohled na levou stranu konstrukce



Pohled na pravou stranu konstrukce



Rozvolnění OP1 pod uložením NK



Pohled na OP2, trhliny, rozvolnění, chybějící spárování



OP2 pravá strana



OP1 pravá strana



Podhled NK



Trhliny ve vozovce



Degradace betonu římsy, koroze zábradlí

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	26834-9		
Název mostu:	Most přes náhon ve Františkově		
Místní název:	Most-Velký Valtinov		
Předmět přemostění:	Vodoteč (občasný průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 26834		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	11.889 km	Staničení na úseku: 1.282 km	
Rok postavení:	1969		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Liberecký		
Okres:	Česká Lípa		
Obec (MČ):	Velký Valtinov		
Katastrální území:	Velký Valtinov		
Správce mostu:	kraj Liberecký, KSS Libereckého kraje, provoz Západ		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 17 \text{ t}$	$V_r = 18 \text{ t}$	$V_e = 24 \text{ t}$	$V_{aj}(V_a) = 12.0 \text{ t}$ Rok: 2016
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 5.40 m	Délka NK: 6.00 m	
Šikmost: Kolmý 100.00 g	Volná šířka: 7.00 m	Celková šířka mostu: 7.50 m	
Plocha mostu: 45.00 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -709902 Y: -973065	WGS: 50.750322°N 14.748094°E	
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
7ks ŽB PREFA nosníků ŽMP-62, dl. 6.0m, v. 0.50m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.60 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
$Q_{100} = -$	Normální hladina vody: 0.00 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 7.00 až 7.00 m	Šířka: 0.80 až 0.80 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 5.40 m	Kolmá světlost: 5.40 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: 6.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP-62		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.00 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové zábradlí.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: VI - Velmi špatný


Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 3.11.2016

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Datum tisku: 4.4.2017 12:59 Vytisknul z BMS: - Machalík Tomáš

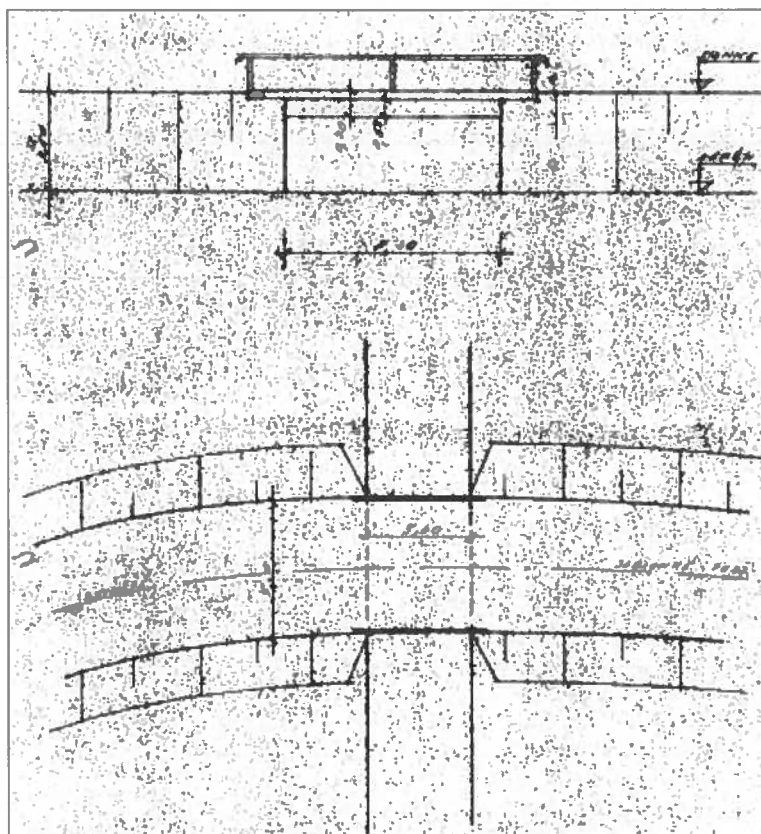

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML

PŘÍLOHA č. 2

PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ DÍLA

Rozsah prováděných projekčních prací v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu, prováděním průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru¹:

1. Průzkumy a zaměření

V rámci zajištění podkladů potřebných pro řádné díla se předpokládá realizace zejména následujících druhů průzkumů:

- Diagnostický průzkum - bude zpracován vždy jako základní podklad pro stanovení technického řešení návrhu stavby a rozsahu navrhovaných prací. V případě diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí vozovek bude při jeho zpracování postupováno v souladu se všemi požadavky TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. V případě diagnostického průzkumu stávajících mostních konstrukcí či konstrukcí propustků, zdí či jejich jednotlivých částí, bude při jeho zpracování postupováno v souladu se všemi požadavky TP 72 - Diagnostický průzkum mostů PK, TP 120 - Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací, TP 183 - Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, potupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emise, TP 200 - Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN a TP224 - Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací.
- Geotechnický průzkum - bude zpracován vždy, pokud budou v rámci stavby navrženy nové konstrukce, k jejichž posouzení je dle platných ČSN třeba znát podrobné geotechnické údaje o jejich podloží. Při jeho zpracování bude postupováno v souladu se všemi požadavky TP 76A - Geotechnický průzkum po pozemní komunikaci a TP 76B - Geotechnický průzkum po pozemní komunikaci - část B, přičemž rozsah průzkumu bude odpovídat požadavkům pro tzv. „Podrobný průzkum“, viz. kap. 4.3 TP 76 A.
- Dendrologický průzkum - bude zpracován vždy, pokud bude zjištěno, že k realizaci navrhované stavby bude zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle §8 odstavce 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

V rámci zajištění podkladů potřebných pro řádné provedení díla bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování dokumentací včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, soliterních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy katastrální mapou. Bude provedeno mapování zobrazení polohopisu a výškopisu zájmového území a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (Zaměření), zjištění hranic pozemků dle KN a/nebo PK a jejich majitelů příp. oprávněných z věcných břemen. Součástí zaměření bude popis povrchu měřeného území, např. asphalt, dlažba betonová, dlažba kamenná apod.

Zákres sítí a hranic pozemků dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data,

¹ Rozsah specifikace je obecnější a zahrnuje i činnosti, které v konkrétním případě nemusí být relevantní. Například pokud specifikace uvádí diagnostiku mostů, je tento popis relevantním pro plnění smlouvy, pouze pokud je předmětem plnění rekonstrukce mostů apod. Skutečný rozsah činností plyne z přílohy č. 4 smlouvy (plněny mají být naceňované položky).

budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

Zaměření bude provedeno s podrobnostmi pro měřítko 1:1000 (v případě malého rozsahu řešeného území 1:500) s přesností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v systému souřadnic S-JTSK a výškovém systému Bpv, a to ve formátu DXF (DWG, DGN), následně bude proveden export dat pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

Jako součást zaměření bude zajištěn mapový podklad pro následné vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby, vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborového elaborátu s výpočtem náhrad.

2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb, dále dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek a požadavků zadavatele a obecně závaznými právními a technickými předpisy. Poskytovatel se musí zavázat, že bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky zadavatele.

3. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Návrh způsobu rekonstrukce krytu či celé konstrukce vozovky bude stanoven na základě provedeného diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí vozovky. Nezbytnou součástí navržené opravy vozovky bude zejména návrh zajištění funkčnosti jejího povrchového odvodnění (součástí bude oprava a pročištění stávajících propustků), včetně řešení příkopů a krajnic. Obecně je zájem zadavatele vyhnout se zásahu do soukromých pozemků.

Obsah jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je určen přílohou č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude dále obsahovat soupis prací s podrobným výkazem výměr (SP). Rozsah soupisu prací s výkazem výměr (SP) je určen vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Rozsah PDPS zahrnuje přílohy a výkresy stavby a stavebních objektů v členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby) (DSP), doplněné o další přílohy a výkresy tak, že dokumentace PDPS bude svým obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovídat požadavkům přílohy č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic a dále podmínkám stanoveným výzvou k podání nabídky, požadavkům objednatele a obecně závazným právním a technickým předpisům, dále je PDPS vypracována ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dokumentace PDPS musí být dále rozpracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrobnější vodítko pro rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby (PDPS) slouží „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury, únor 2007 a její Dodatek č.1 z ledna 2010 a další návazné předpisy v účinném znění.

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen. Technické

specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:

- a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
- b) evropská technická schválení,
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
- d) mezinárodní normy, nebo
- e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Soupis prací s výkazem výměr (SP) bude zpracováván dle třídníku OTSKP-SPK vč. souhrnného listu s podrobným popisem požadovaných standardů. Výkaz výměr musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek, tzn., že v uváděném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé položky. SP musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Soupis prací s výkazem výměr (SP) musí být zpracován v tabulkovém editoru.

Součástí díla bude vedle PDPS i Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR) – oceněný soupis prací s výkazem výměr. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. KR bude zpracován vč. souhrnného listu, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací s výkazem výměr (SP) a kontrolního položkového rozpočtu (KR) jak stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Dopravně inženýrská opatření navržená během stavby (DIO) budou projednána se zástupci dotčených obcí a následně schválena příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosažení co možná nejkratších lhůt výstavby, zadavatel preferuje návrh rekonstrukce komunikace za úplné uzavírky provozu., z důvodu zajištění co nejkratší lhůty výstavby, provedení projektované rekonstrukce za uzavřeného silničního provozu.

Projektová dokumentace bude na rozpiskách označena stupněm PDPS a konkrétním jménem akce.

4. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby

Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení (případně kladných stanovisek k ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby). Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem IČ je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti (zajištění povolení stavby).

Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele, případně na jiný subjekt dle pokynů objednatele. Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden objednatel, případně jiný

subjekt dle pokynů objednatele, jako budoucí oprávněný majetkový správce IS, jako budoucí povinný vlastník pozemku.

Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění povolení stavby.

Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení (případně kladných stanovisek k ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), a to v souladu s právními předpisy.

V rámci výkonu zajištění povolení stavby je zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, výkupy a pronájmy pozemků popřípadě objektů a atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli.

Součástí díla jsou i práce v tomto bodu výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla. Součástí ceny díla jsou veškeré správní poplatky.

5. Autorský dozor během realizace akce

Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“), se bude účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2003.

Zhotovitel bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí svým podpisem na změnovém listu.

V případě, že změna bude vyvolaná chybou v PD, nevzniká zhotoviteli nárok na odměnu.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvedomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvedomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. Předpoklad počtu hodin výkonu AD je součástí přílohy č. 4 této smlouvy. Do sazby za odpracovanou hodinu jsou započítány náklady na dopravu.

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i práce v tomto bodu výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Dokumentace bude předávána objednateli následovně:

Průzkumy a zaměření	<u>Zaměření</u> : 1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD <u>Průzkumy</u> : 6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD – budou odevzdány součástí PDPS
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)	6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD
Jednostupňová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), skládající se z Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a Soupisu prací s výkazem výměr (SP) vč. Soupisu prací s výkazem výměr (SP) bez cen	6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD
Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR)	1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD
Dokladová část	1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD
Originál platného stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby) vč. dokladové části). Součástí je i případné územní rozhodnutí (ÚR)	1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD

Zhotovitel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě, která bude 1x ve formátu pdf. a 1x v otevřeném (editovatelném) formátu .doc, .dwg nebo .dgn a .xls.

Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření, zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

PŘÍLOHA č. 3
VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Předávací protokol

ke smlouvě o dílo č.

Smluvní strany:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

dále jen „objednatel“

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8

IČ: 24668613

dále jen „zhotovitel“

sepisují tento předávací protokol o předání díla na základě smlouvy o dílo č.,
kterou výše uvedené smluvní strany uzavřely dne

Předmět a rozsah plnění:

Smluvní strany potvrzují, že zhotovitel v níže uvedený den, měsíc a rok a v níže uvedeném místě předal
toto dílo:

.....

Čas a místo předání:

Smluvní strany potvrzují, že se předání uskutečnilo dne na pracovišti Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Československé armády 4805/24, 466 05
Jablonec nad Nisou.

Oznámení o výhradách:

Objednatel potvrzuje, že provedl prohlídku předávaného díla a nemá žádné výhrady / má tyto výhrady:

.....

Objednatel s ohledem na uvedené výhrady dílo akceptuje a požaduje odstranění vad díla v souladu s podmínkami smlouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené výhrady dílo odmítá a požaduje odstranění vad díla v souladu s podmínkami smlouvy.

Vyjádření zhotovitele k uvedeným výhradám:

.....

Smluvní strany svým podpisem shodně stvrzují pravdivost údajů uvedených v tomto předávacím protokolu.

V Jablonci n. N. dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

.....

PŘÍLOHA č. 4 PODROBNÝ ROZPIS CENY

Akce: Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření					
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			102 000,00	21 420,00	123 420,00
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87			111 050,00	23 320,50	134 370,50
Dendrologický průzkum podél celého úseku			10 000,00	2 100,00	12 100,00
Diagnostický průzkum mostu ev.č. 26834-5 a ev.č.26834-6 a ev.č.26834-7 a ev.č. 26834-8 a ev.č. 26834-9			40 000,00	8 400,00	48 400,00
Geologický průzkum v souladu s TP 76 - 1 ks vrtané sondy u každého mostu a zdi			105 500,00	22 155,00	127 655,00
2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)					
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby(PDPS)			1 856 700,00	389 907,00	2 246 607,00
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby					
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			20 000,00	4 200,00	24 200,00
4. Autorský dozor během realizace akce	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)			
Autorský dozor	5	950,00	4 750,00	997,50	5 747,50
NÁKLADY CELKEM			2 250 000,00	472 500,00	2 722 500,00

PŘÍLOHA č. 5
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Níže podepsaný účastník předkládá seznam poddodavatelů, které plánuje využít pro plnění části 4 (Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí, rekonstrukce silnice) veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 4. etapa“:

Název a identifikace poddodavatele (Obchodní název, sídlo, IČ)	Slovní popis plnění poddodavatele	Poměr finančního objemu plnění poddodavatele k finančnímu objemu celkového plnění dle smlouvy (v %)
IMOS BRNO, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno IČ: 25322257	Diagnostika vozovky	5%
Vladislav Janů Urbánkova 3363/53, 143 00 Praha 4, Modřany IČ: 02080915	Výkon zeměměřických činností	5%
RNDr. Pavel Polák Ve struhách 990/8, 160 00 Praha 6, Bubeneč IČ: 11238984	Geologické práce	4%
ZAHRADY pro RADOST s.r.o. Blešno 12, 503 46 IČ: 288 164 98	Dendrologický průzkum	0,5%

V Praze dne 19. 09. 2017



ADVISIA s.r.o.

Ing. Robert Weisz

jednatel společnosti

